

Investering  
SFA  
Stefan Rosengren

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

## Lägesrapport SFA komprimerad dec 2025

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att Lägesrapport SFA komprimerad dec 2025 godkänns

att Lägesrapport SFA komprimerad dec 2025 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom.

Christian Rockberger  
Verkställande Direktör

Jenny Bengtsson  
Avdelningschef  
Investering

Bilaga: Lägesrapport SFA komprimerad dec 2025

## Sammanfattning

Lägesrapporten ger en översikt av projektets status per december 2025.

Rapporten baseras på de förutsättningar som fastställdes i det reviderade genomförandebeslutet, beslutat av bolagets styrelse den 7 december 2023.

Projektet fortlöper enligt plan. Överledning av avloppsvatten från Bromma till Henriksdal planeras ske under 2028, och Henriksdals reningsverk beräknas vara fullt färdigställt i samtliga etapper under 2031.

I ledningstunneln pågår fortsatt betong- och förstärkningsarbeten, och nu har även rörinstallationerna påbörjats.

Inom biolinjer etapp 2 har linje 7 överlämnats till drift, medan provdriften av linje 6 närmar sig sitt avslut.

År 2025 har varit ett av projektets mest intensiva år med parallella arbeten inom samtliga anläggningsdelar. En hög aktivitetsnivå förväntas även under 2026.

Totalprognosen ligger i linje med gällande beslut avseende både tidplan och budget.

SLUT

# Stockholms framtida avloppsrening

Komprimerad rapport till styrelse 2025-12-04

Tillsammans för världens  
mest hållbara stad



STOCKHOLM  
VATTEN  
OCH AVFALL

© Stockholm Vatten och Avfall 2025

Författare: Stefan Rosengren stefan.rosengren@svoa.se

Rapporten citeras: Rosengren 2025 Stockholms framtida avloppsrening Komprimerad Rapport  
Stockholm Vatten och Avfall

Diarienummer: Text

Projektnummer: Text

Kontaktuppgifter: Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm

Telefon: 08-522 120 00

Webb: [www.svoa.se](http://www.svoa.se)

## Bakgrund

Stockholm har under många år haft en stark befolkningstillväxt. Enligt befolkningsprognosen kommer staden fortsätta att växa i något dämpad takt de kommande åren, för att därefter åter öka i tillväxt likt tillväxtåren fram till pandemin.

Den historiskt starka befolkningstillväxten har resulterat i att stadens befintliga verk har fått svårare att leva upp till de ökade kraven som tillkommit över tid.

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad den 26 maj 2014 om ett genomförande av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Beslutet innebär bland annat att Bromma reningsverk läggs ner, att en tunnel mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk byggs och att en omfattande om- och tillbyggnad av Henriksdals reningsverk i både Sickla och Henriksdal, genomförs. Projektet innebär att lika stor kapacitet tillförs som den ursprungliga kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Därutöver ska åtgärder genomföras för att utveckla anläggningen till ett av världens modernaste reningsverk. Nedläggningen av Bromma reningsverk bidrar även till att frigöra mark, vilket skapar nya möjligheter att nyttja marken för exempelvis för nya bostäder.

Projektet påbörjades april 2015 med ombyggnation av Henriksdals reningsverk. Under år 2019 påbörjades utvecklingen av Sicklaanläggningen. I januari 2021 driftsattes den första av fyra etapper med den nya membrantekniken i Henriksdal. Membrantekniken levde väl upp till förväntningarna.

I januari 2024 beslutade styrelsen att en rapportering av projektet ska ske vid samtliga styrelsemöten. Samtliga lägesrapporterna kommer även överlämnas till Stockholms stadshus AB.

7 december 2023 fattade styrelsen beslut om nytt reviderat genomförandebeslut, projektet bedömer att tilldelad budget och godkänd övergripande tidplan är rätt och skall ge projektet möjlighet att slutföras inom dessa ramar. Ärendet godkändes i koncernstyrelse den 19 december och i kommunfullmäktige den 29 april 2024.

## Innehållsförteckning

1.	SFAR, Henriksdals reningsverk	5
2.	SFAL, Ledningstunneln	5
3.	Tider	6
4.	Ekonomi	6
5.	Riskhantering	7
6.	Arbetsmiljö	7
7.	Utökad styrning och uppföljning	8
8.	Sammanfattningsvis	8

## 1. SFAR, Henriksdals reningsverk

Biolinjer etapp 2, bestående av linje 6 och 7, är i fas med tidplan. Biolinje 7 är klar och överlämnad. För linje 6 närmar provdriften sitt slut.

Etapp 3 med biolinje 4 och 5 har startat och för närvarande pågår takfällning av berg.

I slamhanteringen pågår installationsarbeten för samtliga teknikdiscipliner enligt plan och driftsättning startar i januari 2026.

Byggnation av ny slamkylbyggnad är klar. Installationsarbeten har påbörjats och förväntas bli klara under 2026.

Renovering av rötammare 6 pågår och ligger före tidplan.

I Sickla pågår betongarbeten för försedimenteringsbassänger och pumpstationen. Byggnadsarbeten och installationer pågår även i den nya teknikbyggnaden utanför bergutrymmet. Kritisk tidslinje för Sicklas arbeten är påverkat av den försenade bergentreprenaden som styr när Bromma kan kopplas in. Åtgärder av befintliga delar som visat sig vara i dåligt skick pågår också.

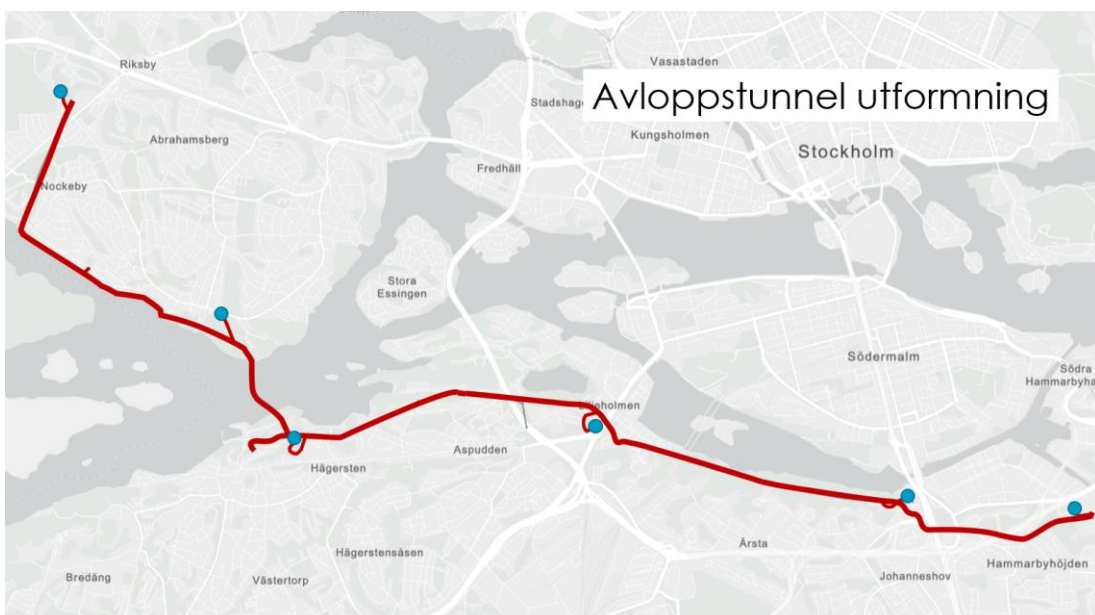


Bild 1. Slamkylbyggnaden 2025-09-17

## 2. SFAL, Ledningstunneln

Arbeten med att gjuta botten i tunneln och förstärkningsarbeten i Mälarpassagen pågår. Även rörinstallationerna är påbörjade.

Samtliga anslutningsarbeten av pumpstationer och bräddpunkter är genomförda.



### 3. Tider

Bolagets bedömning är att biolinjerna fortsatt är på projektets kritiska linje och styr såväl övertiden för när SYVAB flödet kan ledas över till Henriksdal som tidpunkten för när Bromma reningsverk kan kopplas bort. I Sickla är arbeten med pumpstationen kritiska och i tunneln är betongarbeten i Mälarpassagen kritisk. Båda dessa delar kan komma att hamna på projektets kritiska linje, arbeten pågår kontinuerligt för att undvika att detta sker. Nedanstående aktiviteter är avstämde i oktober 2025.

Aktivitet	Färdigställande tid
<b>Biolinjer etapp 2</b>	Kvartal 3 2025
<b>Inkoppling SYVAB</b>	Kvartal 4 2027
<b>Sicklaanläggningen färdigställd</b>	Kvartal 3 2028
<b>Biolinjer etapp 3</b>	Kvartal 4 2028
<b>Bortkoppling Bromma reningsverk</b>	Kvartal 4 2028
<b>Biolinjer etapp 4</b>	Kvartal 4 2031

### 4. Ekonomi

Den ekonomiska sammanställningen uppdaterad med utfall för september 2025.

Indexerad budget 2024-03 är beräknad enligt verkligt utfall. Ny indexuppräknings är under framtagande.

Den indexerade budgeten underskrider i dagsläget slutkostnadsprognosen i löpande penningvärde på 22500 mkr som redovisas i det reviderade genomförandebeslutet.

2025 är ett av projektets tyngsta år vad gäller aktiviteter, alla olika anläggningsdelar är igång. Som mest beräknas cirka 800 yrkesarbetare att vara igång.

Projektreserven bedöms vara tillräcklig för projektets färdigställande utifrån genomförda simuleringar av riskutfall.

SFA	2025			Total			
	Utfall 2025-09	Budget 2025	P2 2025	Utfall	Budget	Indexerad budget 24-03	Budget inklusive framtida index
Stab	30 408	25 559	27 397	570 233	640 000	644 755	
SFAL (Tunnel)	242 157	309 529	251 580	2 611 847	3 138 000	3 124 089	
SFAR (Reningsverk)	1 236 844	1 603 977	1 752 654	9 032 626	12 858 000	12 898 900	
Ränta	190 612	216 491	203 133	669 972	1 054 000	1 063 000	
Projektreserv					1 810 000	1 866 077	
SFA	1 700 022	2 155 556	2 234 764	12 884 678	19 500 000	19 596 821	22 500 000



## 5. Riskhantering

Arbetet med den kontinuerliga riskhanteringsarbetet inom SFA och delprojekten fortgår. Uppföljning av den fördjupade riskanalysen, riskkostnadsanalys, kommer genomföras under december.

De största övergripande riskerna är fortsatt kopplade till en av entreprenörernas genomförande, dock visar entreprenören på ett bra driv och gör insatser för att säkerställa sitt genomförande till färdigställande.

2025-09-16	SFA	SFAL	SFAR	Totalt antal risker
Totalt antal risker per projekt/ delprojekt	<b>1 (1)</b>	<b>33 (33)</b>	<b>68 (69)</b>	<b>102 (103)</b>
	Antal risker per kategori	Antal risker per kategori	Antal risker per kategori	Totalt antal risker per kategori
<b>Röda</b>	1 (1)	4 (4)	5 (6)	10 (11)
<b>Gula</b>	0 (0)	8 (8)	14 (15)	22 (23)
<b>Gröna</b>	0 (0)	21 (21)	49 (48)	70 (69)

## 6. Arbetsmiljö

I Sickla finns det fortsatt utmaningar med arbetsmiljön. Dialog med entreprenören pågår för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet är på en bra nivå.

### Entreprenörer

Tabell över antalet sysselsatta entreprenörer inom SFA. (Siffror från föregående rapport)

	Snitt daglig närvaro	Antal unika närvarande senaste månaden
<b>Henriksdal</b>	211 (194)	485 (385)
<b>Sickla</b>	251 (315)	727 (602)
<b>Ledningstunnel</b>	158 (N/A)	521 (N/A)

## 7. Utökad styrning och uppföljning

För att säkerställa framdrift och kontroll i arbetet med uppdragen som gavs i samband med det reviderade genomförandebeslutet har ett antal åtgärder vidtagits.

Styrgruppen har ny representant från Stadshus AB. Styrgruppen följer upp de uppdrag som gavs i samband med genomförandebeslutet och dessa protokollförs vid varje styrgruppsmöte.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa en allt bättre kontroll och effektivare styrning. Det fördjupade riskarbetet är igång och utfallet stämmer så här långt väl överens med tidigare analyser. En uppföljning är planerad i december 2025.

Projektet och linjeorganisationen arbetar kontinuerligt med att säkra effektiva processer inför driftsättningen och överlämnandet av färdiga anläggningsdelar. Dessa rutiner prövas nu i kommande överlämningar.

Projektet arbetar kontinuerligt i samarbete med utförare för att finna och effektuera effektiviseringar i syfte att korta tidplan och minska kostnader. Insatser för att säkra och korta utförandetider pågår på flera delar av projektet. Resultatet av dessa redovisas löpande för styrgruppen.

## 8. Sammanfattningsvis

De risker som beskrivs i rapporten bedöms rymmas inom den projektreserv som finns i förslaget till reviderat genomförandebeslut. Även de tidsrisker som lyfts beräknas hanteras inom projektets totala tidsramar.

Installationen av biolinjerna är fortsatt den anläggningsdel som är kritisk för projektets färdigställande.
