


Projektname	Upprustning Knutby motionsspår
--------------------	--------------------------------

Geografisk plats för investering	Bromsten, Spånga-Tensta
---	-------------------------

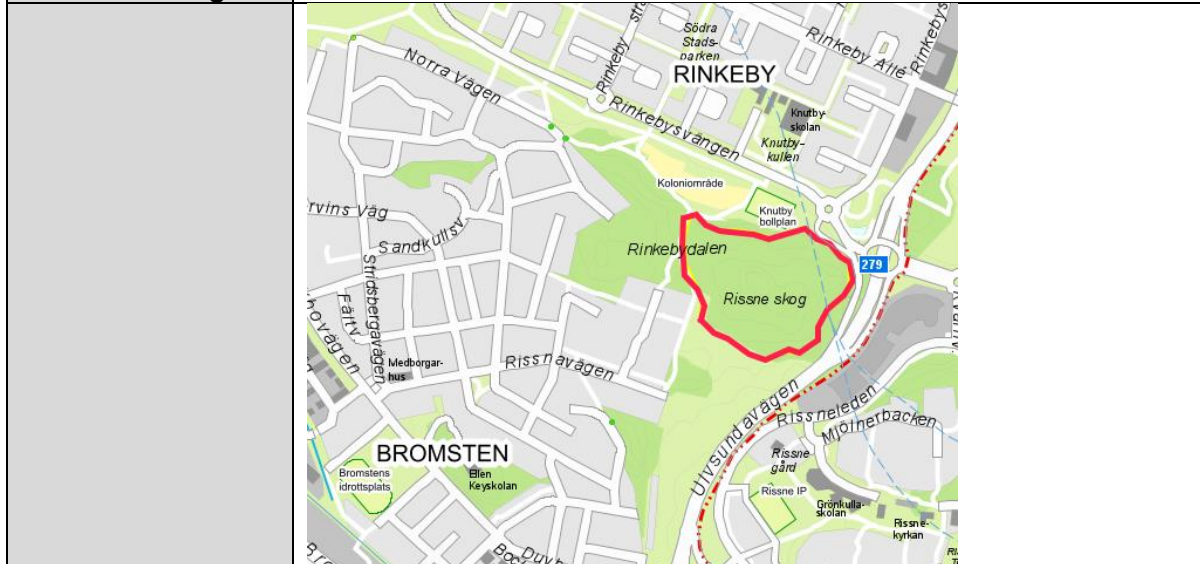

Projektets mål och syfte	<p>En motionsslinga som av många ses som osäker plats som inte gärna besöks på mörkare tider av året. Den fick nerslag i idrottsförvaltningens inventering under förra året, där ibland att belysningen var dålig. Stadsdelen mottar regelbundet synpunkter gällande trygghetsfrågor i detta område samt att belysningen varit svår att hålla efter i driften.</p>
---------------------------------	--

Slutredovisning/delredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Insatserna med belysningen och vegetationsröjningen har fått mycket uppskattning av invånarna och positiv media. Riskträd och störande vegetation har kunnat tas bort och belysningsstolparna av trä har besiktats och bytts ut där det behövs.</p>		
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter		Budget	Utfall 2020
	Belysningsarbeten	500 000	300 000
	Vegetationsarbeten:	200 000	150 000

	Arbetet kan fortsätta under 2021 om det godkänns, då det finns fler investeringar att göra i elljusspåret.
--	--

Bilder före	
Bilder efter	
