





Projektnamn	Trygghetsskapande konstutsmyckning i Nidarosparken, Husby
Geografisk plats för investering	Nidarosparken, Husby, Järva stadsdelsområde Koordinater: 59.408632, 17.931316
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektets övergripande mål är att öka den upplevda tryggheten i och kring Nidarosparken i Husby genom konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön. Syftet är att bidra till en mer levande, inkluderande och omhändertagen parkmiljö som uppmuntrar till vistelse, rörelse och social samvaro, särskilt för barn och unga.</p> <p>Genom att involvera feriearbetande ungdomar från Järva i utformningen av konstutsmyckningen syftar projektet även till att stärka delaktighet, ägandeskap och stolthet över den egna närmiljön, vilket på sikt bidrar till minskad skadegörelse och ökad trygghet.</p>

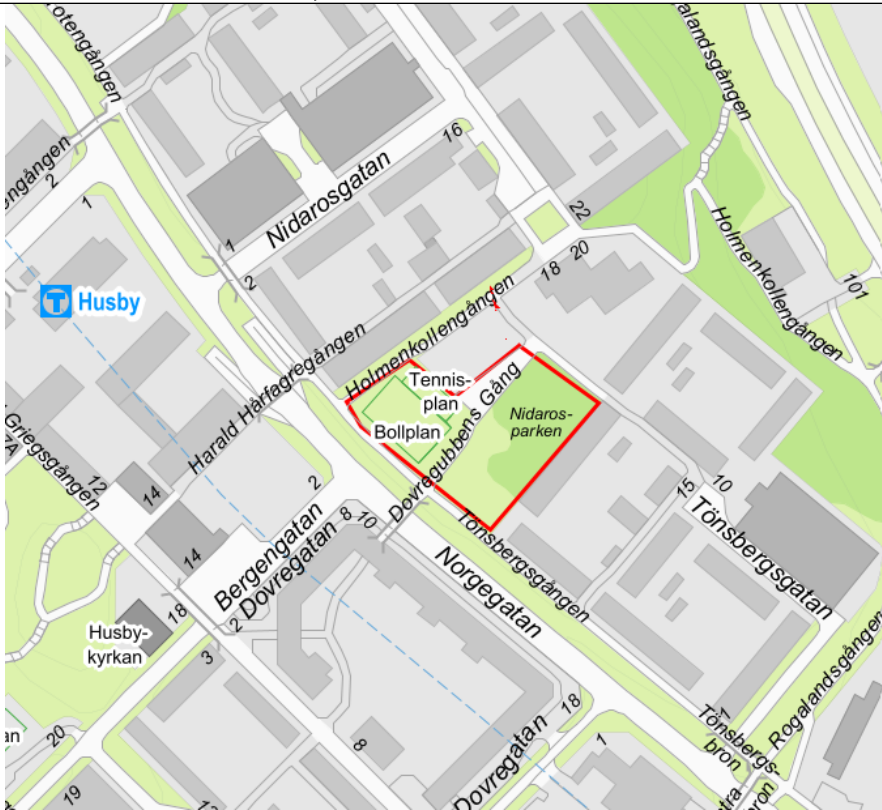

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Projektet har genomförts i enlighet med investeringens mål och syfte genom en konstnärlig process där trygghetsskapande konst har utformats för att integreras i Nidarosparkens gestaltning. Utformning och framtagandet av konstutsmyckningen har genomförts under konstnärlig och pedagogisk ledning tillsammans med feriearbetande ungdomar från stadsdelsområdet.</p> <p>På grund av att tidplanen för den övergripande parkupprustningen har förlängts har den fysiska installationen av konstutsmyckningen ännu inte kunnat genomföras på plats. Konsten är avsedd att integreras i den asfalterade aktivitetsytan i samband med färdigställandet av parkens ombyggnation. När installationen genomförs bedöms insatsen bidra till en mer levande, omhändertagen och identitetsskapande parkmiljö som svarar mot platsens behov av trygghetsskapande åtgärder.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Den avvikelse som förekommer i projektets genomförande är att den fysiska installationen av konstutsmyckningen ännu inte har utförts. Orsaken är att tidplanen för Nidarosparkens upprustning har förlängts, vilket påverkat möjligheten att genomföra arbeten i parken under ursprungligen planerad period.</p> <p>Avvikelsen bedöms inte påverka projektets mål, kvalitet eller ekonomiska ramar. Installation av konstutsmyckningen planeras att ske i samordning med färdigställandet av parkupprustningen och i dialog med berörda förvaltningar.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Det ekonomiska utfallet av projektet blev lägre (0,15 mnkr) än den budget som angavs i ansökan (0,3 mnkr). Avvikelsen beror främst på att genomförandet krävde färre arbetstimmar än beräknat samt att materialkostnaderna för konstutsmyckningen blev lägre än ursprunglig kalkyl. Kostnad för montering kommer hamna på 2026 års budget.</p> <p>Projektets innehåll, kvalitet och måluppfyllelse har inte påverkats negativt av det lägre kostnadsutfallet. Den konstnärliga processen och delaktigheten från feriearbetande ungdomar har kunnat genomföras enligt plan.</p> <p>Utöver detta har en tilläggsbeställning på 3500 kr gjorts för att komplettera konstverket med en informationsskylt. Kostnaderna för detta går inte på sökta medel.</p>

<p>Bilder före</p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p> 
<p>Bilder efter</p>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p> <p>Bild på en del av konstverket.</p>

