
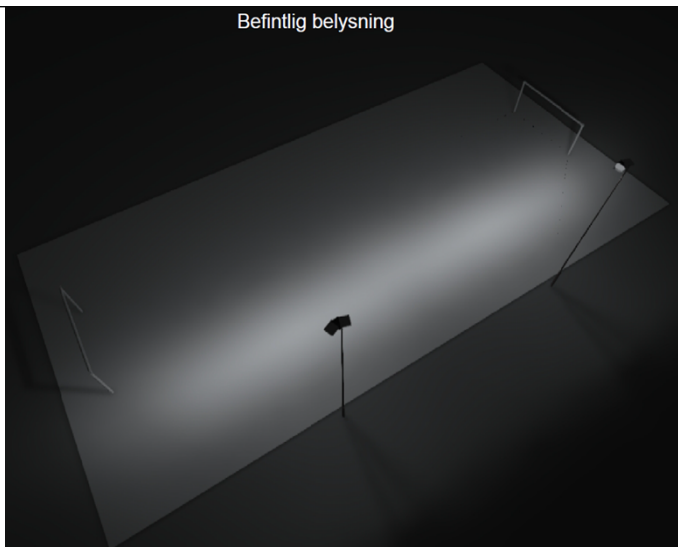


|   |  |
|---|--|
| <b>Projektname</b>                      | <b>Belysning av fotbollsplanen invid lekparken, Gamla Bromstenvägen i Bällsta.</b>   |
| <b>Geografisk plats för investering</b> | <i>Bromstenvägen, Bällsta, Bromma</i><br>     |
| <b>Projektets mål och syfte</b>         | Öka tryggheten, öka tillgängligheten samt bidra till att fler använder och befolkar parkområdet även under dygnets mörka timmar. |

## Slutredovisning

|   |   |
|---|---|
| <b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b> | <p>Belysningen på fotbollsplanen har upplevts som svag och otillräcklig under hösten och vintern. Bollplanen används flitigt året runt eftersom den även spolas till en isbana vintertid. Genom att byta ut den ålderstigna belysningen bedömdes åtgärden öka tryggheten, öka tillgängligheten samt bidra till att fler använder och befolkar parkområdet även under dygnets mörka timmar.</p> <p>Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i enkätform under 2023.</p> <p>Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller via annons i lokaltidningen.</p> |
| <b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>   | Inga avvikelser.  |
| <b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>                            | Förvaltningen ansökte om 0,2 mnkr och beviljades 0,2 mnkr. Utfallet blev 0,2 mnkr.  |

Bilde  
r före



Bilde  
r  
efter



*bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

