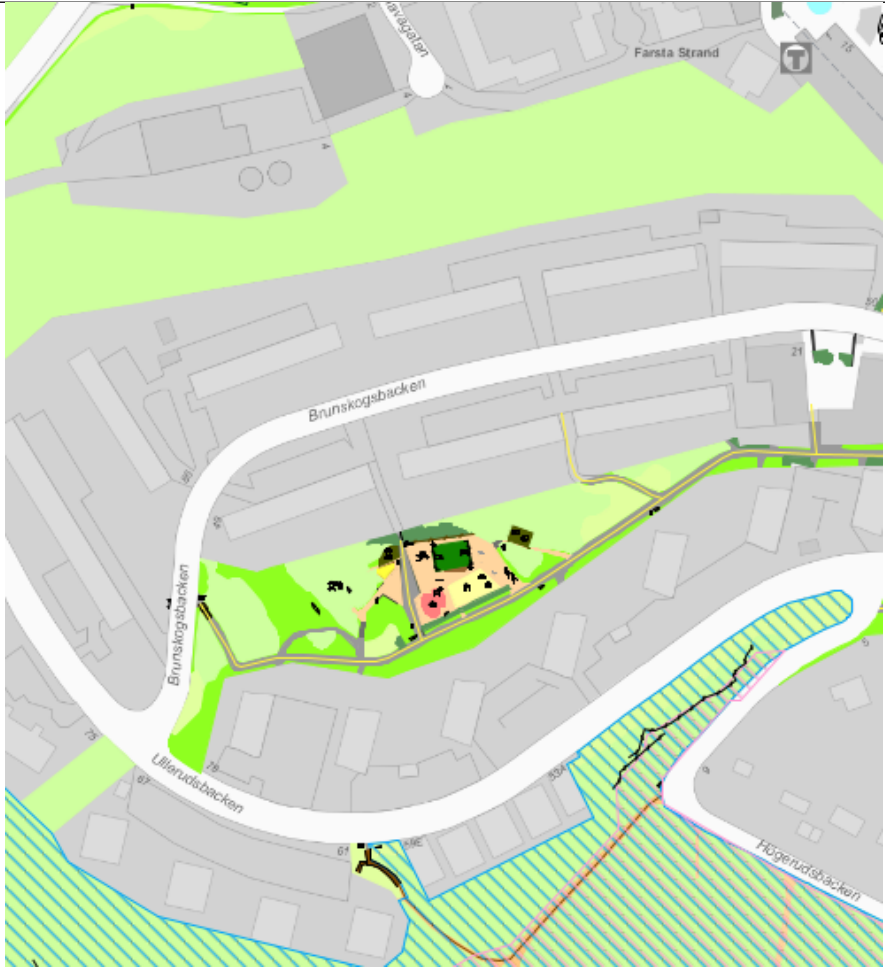


<b>Projektnamn</b>	Trygghetsåtgärder Brunskogsbacken och Ullerudsbacken
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Brunskogsbacken, Farsta strand</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Trygghetslyft kopplat till åtgärder som inte kunde genomföras inom befintlig driftbudget efter trygghetsvandring. Målet har varit ett generellt lyft av platsen som har varit suboptimalt skött samt få fler att använda platsen och därigenom öka antalet kapabla väktare. Bredda parkväg, anlägga sittplatser, byta ut en sliten grusplan mot en boulebana, tillföra fler belysningspunkter och ta bort slitna och oanvända anläggningar.</p> <p>De effekter vi hoppas se är en lägre andel som upplever en otrygghet utomhus i trygghetsmätningen. Att fler vistas på och passerar förbi platsen. Att fler anmäler brott samt felanmäler brister i stadsmiljön.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Genomförandet blev klart under november månad, det är därmed för tidigt att utvärdera insatsens resultat. Den respons vi har fått från boende och verksamma i området har varit otvetydigt mycket positiva och upplevelsen på platsen är idag en annan från tidigare.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Inga avvikelser.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Ansökt och beviljat: 400 000 kronor Utfall: 403 000 kronor

*Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*

Före grillplatsen:



Efter grillplatsen:



Parkväg breddad, nya belysningspunkter:





Tyvärr inga andra bilder p.g.a. stora snömängder när vi hade planerat att åka ut och fotografera.

**Bilder efter**

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*
