




Projektnamn	Skogshundrastgård i Hökarängen
Geografisk plats för investering	Skogsområde mellan Selaöv/Hauptv/Örbyleden i Hökarängen
	
Projektets mål och syfte	Målet är att öka flödet av folk på platsen och på så sätt ha fler ”kapabla väktare” som rörs sig i området. Syftet är att försämbra förutsättningarna för eventuella gärningspersoner och därmed minska brott och ordningsstörningar.

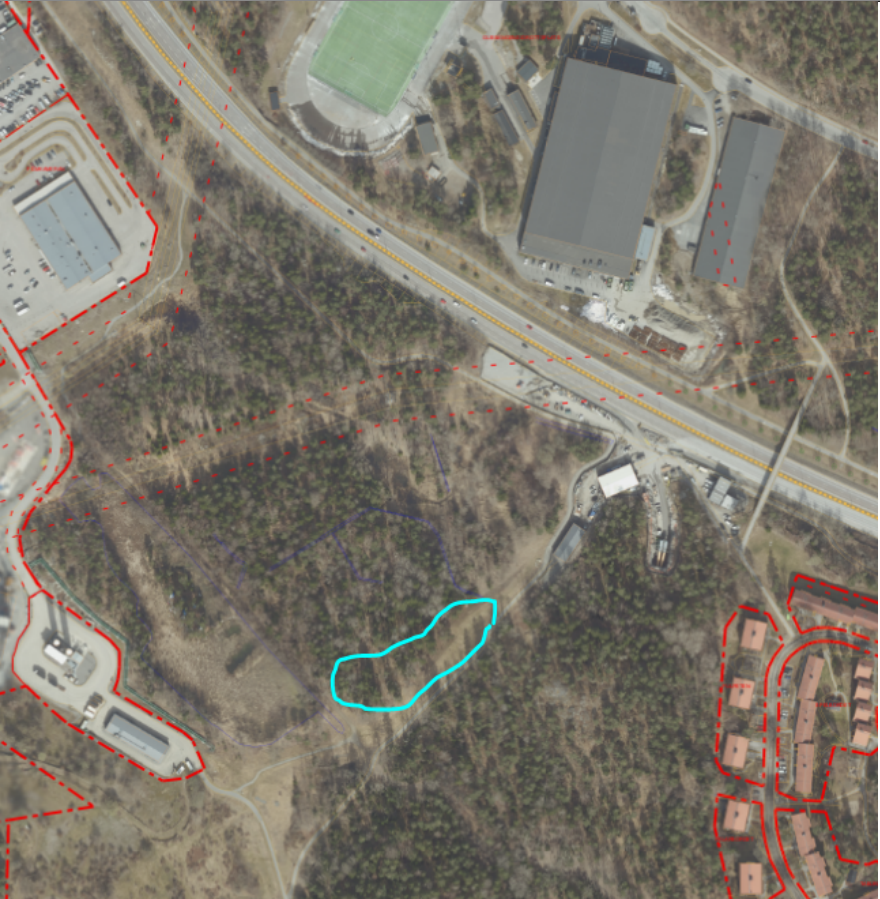

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Anläggningen har genomförts senare under året än vad som planerats (se nedan) så någon konkret utvärdering har inte kunnat göras. Dock har många förbipasserande hundägare uttryckt sin glädje över anläggningen och att de har sett fram emot att använda den. Detta tolkar vi som att platsen kommer att befolkas mer än vad den är idag då det bara är en passage. Öppningen av hundrastgården har redan uppmärksammats med två positiva artiklar i Mitti.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	På grund av oklara och delvis missvisande uppgifter från ledningsägare behövde utredning av läget för ledningar göras. Det visade sig att vi kunde anlägga hundrastgården som planterat. Arbetet startade under senhösten och blev klar strax innan årsskiftet. Dock kvarstår arbeten som trafikkontoret ska göra på sin belysningsanläggning utanför hundrastgården för kompletterande belysning riktade mot entréerna.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Entreprenad och stadsdelens arbete: 827 757:- Belysning trafikkontoret: 23 628:- Skyltar inköp: 8 944:- Totalt: 860 329:- Avvikelse: 139 671:- Kostnaden för projektet blev lite lägre än beräknat på grund av att den stängslade ytan blev mindre än planerat. Detta på grund av nödvändig anpassning till nivåskillnader i terrängen.

Bilder före	<i>Bild från Stockholms gatubilder:</i> 
Bilder efter	 <i>Delen för större hundar med agility-utrustning</i>



Entréerna med sittplatser och skräpkorgar.
