



Projektnamn	<i>Frisikt Farsta</i>
Geografisk plats för investering	<i>Lekplatsen Klyftan, Kristinehamnsgatan 85, Farsta</i> 
Projektets mål och syfte	Projektets mål är att tillskapa länge siktlinjer mellan punkterna inom ovan inringade område. Detta för att kunna se mer av sin omgivning och förändringar i den samt för mer ljusinsläpp. Syftet är att personer som tar sig fram till fots och eller cykel längs med gångvägen ska ha bästa förutsättningar att ha översikt över sin omgivning.




Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Den gulmarkerade ytan som tidigare bestått av siktskymmande buskar har ersatts med gräsyta (gulmarkerad) vari lökar har planterats för ökad biologisk mångfald. Valet av nya buskar från nuvarande siktskymmande (grönmarkerad) ha resulterat i sorter som är lägre växande och som gynnar pollinatörer. Eftersom de höga buskarna har ersatts av lägre har längre siktlinjer genererats, vilket framgår från före och efter bilderna. Då arbetet slutfördes under sista kvartalet 2025 har ännu ingen konkret utvärdering kunnat göras. Insatsen kommer att utvärderas under första halvåret 2026.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Stadsdelsnämnden ansökte om ca 500tkr för åtgärden. Genomförandet landade under kalkylen och slutade på 340 tkr.

Bilder före



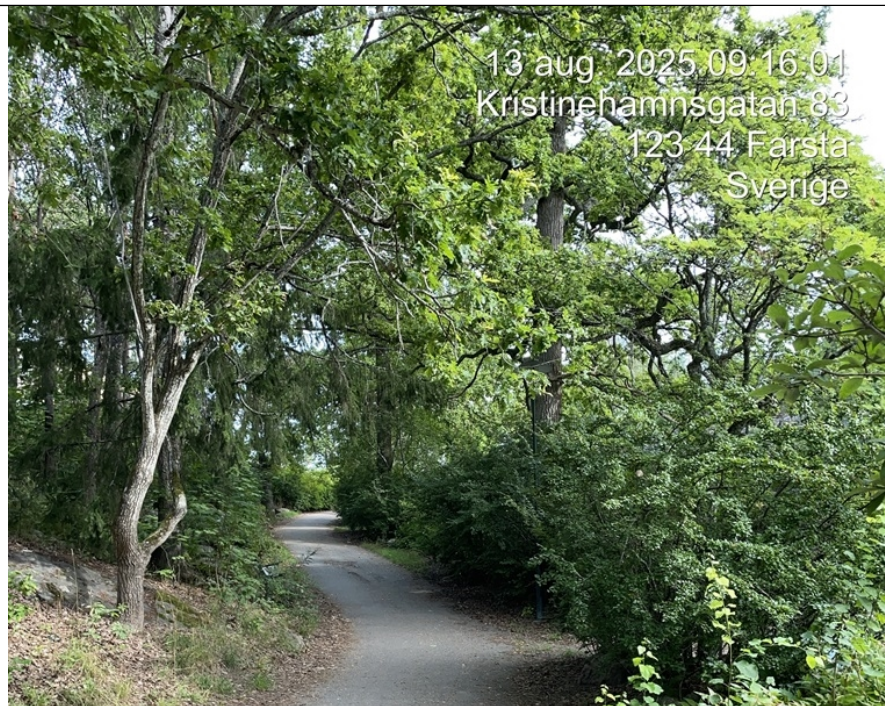

Bilder efter



