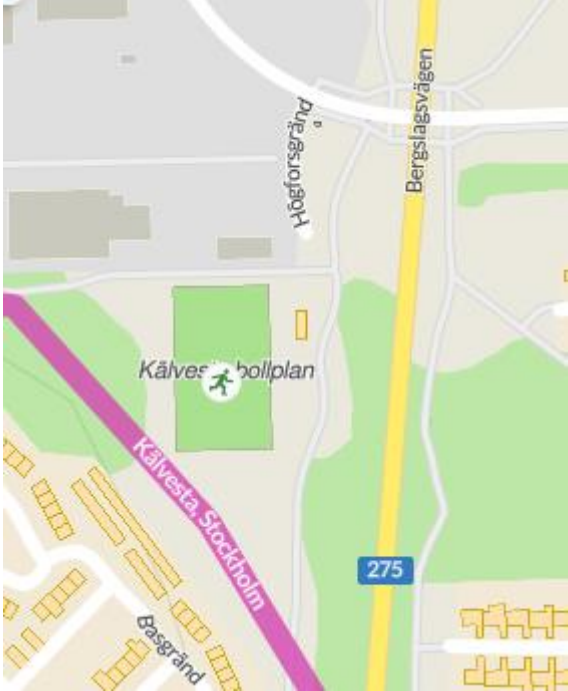


<b>Projektname</b>	Mötesplats Kälvesta
<b>Geografisk plats för investering</b>	Högforsgränd bollplanen ligger på gränsen mellan sdf Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Kälvesta bollplan var en nedgången och eftersatt bollplan. Den användes oregelbundet eftersom det var en grusplan. Föreningar, allmänhet och skolor önskar att träna och spela på konstgräs.</p> <p>Stockholm ska vara en sammanhållen stad där alla ska känna sig trygga. Kälvesta BP kunde upplevas som mörk och övergiven. För att skapa en social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker fanns det behov av att modernisera Kälvesta bollplan. Projektet Mötesplats Kälvesta ska skapa förutsättningar för utveckling av ett mer aktivt föreningsliv i Kälvesta med fokus på fotboll för alla.</p> <p>I projektet ingår att ta fram projektering, förfrågningsunderlag inför en upprustning av anläggningen och anläggande av en 11-spelsplan med konstgräs på Kälvesta BP. Anläggningen ska förses med belysning som möjliggör ökade nyttjandetider och skapar en trygg miljö kvällstid. Avsedda åtgärder kommer på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.</p>

## Delrapport/slutredovisning

<p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p>	<p>Projektet med Kälvesta BP har genomförts och under hösten 2019 skedde invigningen av planen. Grusplanen har blivit en konstgräsplan, med ny belysning. De åtgärder som utförts står i linje med det som projektet hade som mål och syfte. Åtgärderna har skapat och gett förutsättningar för spontanidrott samt för föreningslivet att nyttja planen vilket har varit efterfrågat i området.</p> <p>Kvarvarande åtgärder med belysningen kommer att utföras våren 2020.</p>
<p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>	<p>Den första upphandlingen för Kälvesta BP avbröts för att alla giltiga inkomna anbud överskred budgeten för projektet.</p> <p>Nytt förfrågningsunderlag lades ut på Tendsign och kontoret har tecknat avtal med entreprenör för att anlägga en konstgräsplan på Kälvesta BP.</p> <p>Invigning av planen skedde under hösten 2019, och planen har en stor nyttjandegrad. I samband med projektet har även omklädningsbyggnaden rustats upp invändigt. Parkeringsytan intill bollplanen kommer få en höjdregering i form av en bom för att förhindra otillåten trafik.</p> <p>Intill planen har också en upplagsyta för snö byggd, men installerade granulatfällor. För att möjliggöra spel under vintersäsongen.</p> <p>Kvarvarande åtgärder med belysningen kommer att utföras våren 2020.</p>
<p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b></p>	<p>Totalt utfall t.om 2019-12-31: 13,1 mnkr</p> <p>Beviljat belopp från Boverket: 5 035 000 kr Total budget enligt genomförandebeslut är 10 000 000 kr.</p> <p>Under projektets gång har kompletteringar/önskemål tillkommit vilket medfört att prognosen, utfallet har ökat.</p>

--	--

<b>Bil der för e</b>	<i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
<b>Bil der efte r</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

