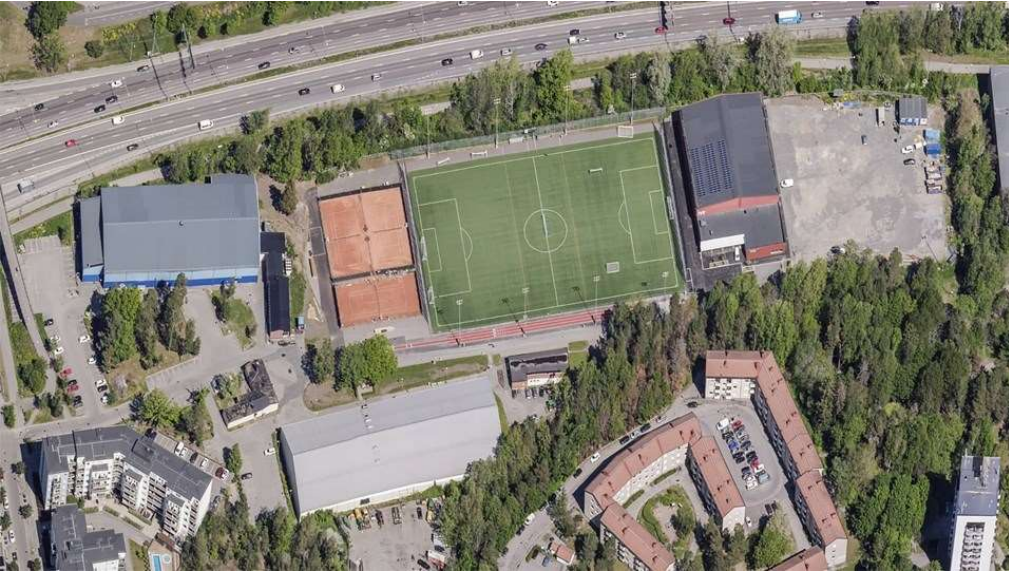


Projektnamn	<i>Trygghetsskapande åtgärder vid Mälarhöjdens IP</i>
Geografik plats för investering	Mälarhöjdens IP Västberga 1:1
Kartbild	
Projektets mål och syfte	<p>Mälarhöjdens IP är belägen i stadsdelen Hägersten-Älvsjö och är en idrottsplats som inrymmer konstgräsplan, ishall, och gymnastikhall. Därtill finns på idrottsplatsen en tennishall samt tomhustennisbanor. Inne och omkring idrottsplatsen har trygghetsbrister identifierats, som delvis kan åtgärdas med fysiska åtgärder. Dessa består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förstärkning av belysning kring huvudentré och parkering vid idrottsplatsens västra del. • Anläggande av tillgänglig och tydlig gång- och cykelkoppling mellan parkmark och idrottsplats/mark inklusive belysning i idrottsplatsen sydöstra del. Arbetena samordnas med stadsdelsförvaltningen som fått trygghetsmedel för parkväg med belysning för samma plats. • Anläggande av utegym med tillhörande belysning på grusytan utanför gymnastikhallen.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Vid huvudentrén och parkeringen vid idrottsplatsens västra del förstärkte vi befintliga belysningsstolpar med nya armaturer samt monterade 20st nya belysningsstolpar.</p> <p>En tillgänglig gång-och cykelbana inklusive belysningsstolpar anlades vid idrottsplatsens sydöstra del. Denna samordnades med stadsdelsförvaltningen som anlade gång- och cykelbanan på sin mark fram till fruängens centrum.</p> <p>Vi röjde även bort sly och buskage för att öka genomsiktligheten och göra platsen mer trygg. Det gamla rostiga staketet byttes ut vid idrottsplatsens bakre entré och cykelbommar samt hänvisningsskyltar monterades.</p> <p>Ett utegym anlades på grusytan utanför gymnastikhallen.</p> <p>Idrottsplatsen upplevs efter åtgärderna betydligt tryggare och idrottsplatsens bakre entré är mycket ljusare och mer lättillgänglig.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Förutom de tre delar som ingick i trygghetssatsningen hade vi även pengar över till utbyte av gammalt staket vid idrottsplatsens bakre entré, cykelbommar och hänvisningsskyltar.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Beslutad projekt budget: 3,5 mnkr Slutkostnad: 3,15 mnkr</p> <p>Slutkostnaden understiger budget.</p>

**Bilder
före**

*Infoga **om** bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*

**Bilder
efter**





