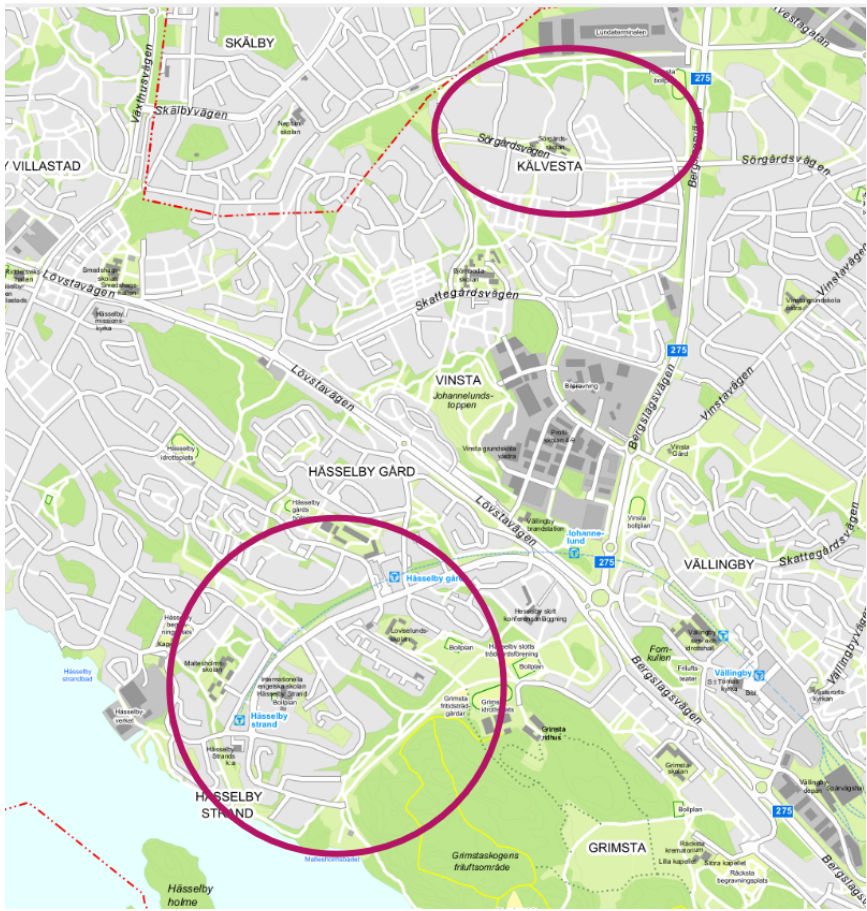


| | |
|--------------------|--|
| Projektname | <i>Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta</i> |
|--------------------|--|

| | |
|---|--|
| Geografisk plats för investering | <p>Hässelby strand västra 59.362868561539514, 17.831575053638215</p> <p>Hässelby strand östra 59.362367779915076, 17.836594257500504, 59.362339874485556, 17.829895501908496</p> <p>Kälvesta norra 59.38325670321715, 17.858973496780155</p> |
|---|--|


| | |
|--|--|
| | <p>Eventuell kartbild.</p>  |
|--|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Projektets mål och syfte | <p>Förvaltningen har ersatt skymmande buskvegetation med blommande växter runt kommunikationsstråk och parkvägar Hässelby med omnejd. Syftet är att öka den upplevda tryggheten genom förbättrad sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden främjas genom att pollinatorsvänliga växter väljs som ersättare. Minskad buskvegetation kan även gynna träd och trädlevande arter genom att de får ökad solbelysning. Slutligen främjar insatsen hållbart resande genom att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och busstrafik på så sätt motverka onödigt bilåkande och skjutning.</p> |
|---------------------------------|--|

Slutredovisning

| | |
|---|---|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | Årets insatser för att höja tryggheten i de områden där projektet gjorts har fått stort genomslag. Ett effektivare tillvägagångssätt har använts i och med ny entreprenör och det har nått mycket goda resultat som invånarna och stadsdelsförvaltningen kommer att kunna njuta av under en längre tid. Gångstråken har blivit mycket luftigare och det är nu genomsiktighet från ett stråk till ett annat vilket kan öka den upplevda tryggheten då mer av omgivningen kan ses. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Uppstarten av projektet kom igång senare än vad som hade önskats på grund av att en upphandlingsprocess drog ut på tiden och det gjorde att entreprenören inte var tillgänglig förrän sommaren 2025. Allt hann inte heller slutföras under 2025 utan en del arbeten pågår fortfarande med att slutföra en del ytor, exempelvis med återplanteringar i mindre skala. |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Det nya tillvägagångssättet, med ett grundligare arbete där maskiner kan användas i större utsträckning, gjorde att de planerade kostnaderna ökade. Kostnaderna har även ökat p.g.a. att arbetet drog igång efter sommarlovet, vilket innebar att det behövts mer personal som jobbat tillsammans på platser som är nära skolor för att säkerställa att barnen kunde passera säkert. Detta har inneburit att SDF har ändrat om bland de ytor som genomförts under 2025 och de ytor som kvarstår har vi istället lyft upp till en ny ansökan för 2026 då vi gärna vill fullfölja dessa insatser då det har mycket goda effekter och har uppskattats. Eftersom den ansökan har avslagits är det osäkert om stadsdelsförvaltningens interna budget räcker för att säkerställa omställningen av de kvarvarande ytorna då det inte fanns med i planen. |

| | |
|---------------------|--|
| Bilder före | <p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>     <p>Sommar 2025</p> <p>U.t.v.: trappa mellan Stråket och Fyrspanngatan</p> <p>n.t.v.: gångväg från Piongränd, Hässelby strand</p> <p>u.t.h.: gångväg innanför Aprikosgatan, Hässelby strand</p> <p>n.t.h.: gångväg i Kälvesta</p> |
| Bilder efter | <p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p> |

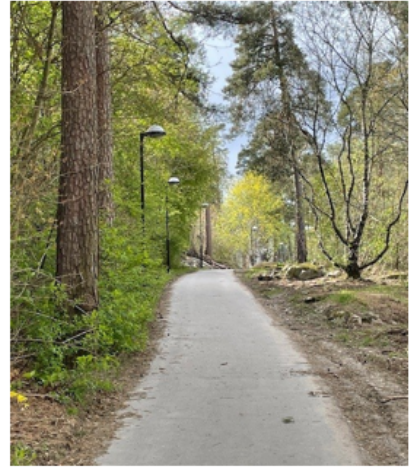

Vår 2026

U.t.v.: trappa mellan Stråket och
Fyrspanngatan

n.t.v.: gångväg från Piongränd,
Hässelby strand

u.t.h.: gångväg innanför Aprikosgatan,
Hässelby strand

n.t.h.: gångväg i Kälvesta

(de planterade vårlökarna har inte börjat blomma än på bilderna)
