


Projektname	<i>Lättingeparken belysning</i>
Geografisk plats för investering	<i>Järva stadsdelsförvaltning; Lättingeparken, nordöstra Tensta</i>
	
Projektets mål och syfte	Komplettera den nya parken med effektiv och rumsbildande belysning. En bättre belyst samlingsplats som lockar till sig positiv närvaro genom familjer och vuxna besökare i parken och även göra att denna del av stadsdelen upplevs ljusare och tryggare.

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Den nybyggda parken behövde kompletteras med ny belysning och nu lyser det. Parken har fått höga master med linspänd belysning mellan sig, detta skapar en effekt av ett tak i parken. Masterna är placerade kring samlingsplatsen och grillarna i parken, de har även spotlights som riktas ner mot till exempel de brädspel som finns infällda i borden.</p> <p>Inom projektet så förbättrades även gångvägsbelysningen på sträckorna precis utanför själva parken. Detta för att locka besökare in i parken och göra detta område ljusare.</p>						
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Belysningen hann inte installeras klart under 2022 på grund av långa leveranstider.</p>						
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Det ekonomiska utfallet blev högre än de första beräkningarna. Förklaring till det är ökade materialkostnader, dyrare leveranser och en initialt missvisande kalkyl.</p> <table data-bbox="596 1182 1123 1294"> <tr> <td>Trygghetsprojekt 2022</td> <td>250 000</td> </tr> <tr> <td>Trygghetsprojekt 2023</td> <td>400 000</td> </tr> <tr> <td>Nycklade investeringsmedel</td> <td>175 000</td> </tr> </table>	Trygghetsprojekt 2022	250 000	Trygghetsprojekt 2023	400 000	Nycklade investeringsmedel	175 000
Trygghetsprojekt 2022	250 000						
Trygghetsprojekt 2023	400 000						
Nycklade investeringsmedel	175 000						
<p>Bilder före</p>	 <p><i>Lättingeparken före trygghetsprojektet, önskningar om bättre belysning och mer aktivering är synpunkter som inkommit.</i></p>						

Bilder efter




Bild på masterna med strålkastare och ljusslingorna över borden

Bilder efter



Mast med strålkastare vid lekutrustningen

Bild efter

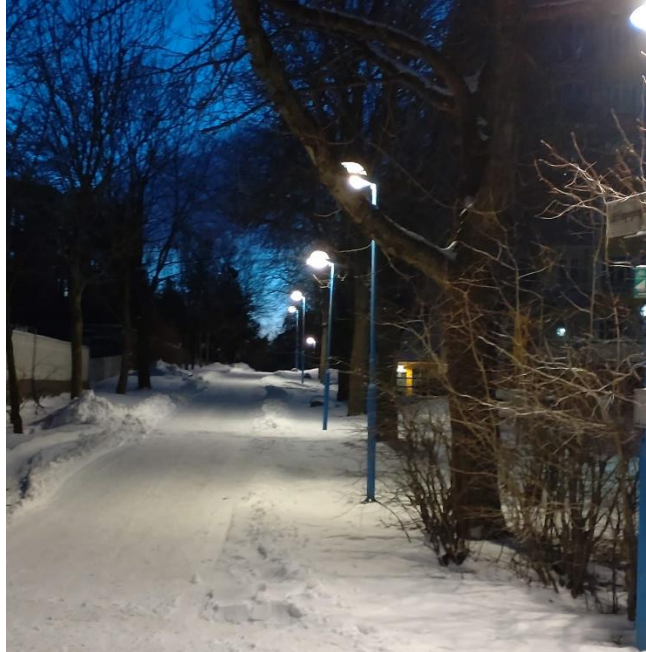

Lättingegången östlig riktning som fått kompletterande lyktstolpar som flyttades om när de nya masterna tillkom i parken
