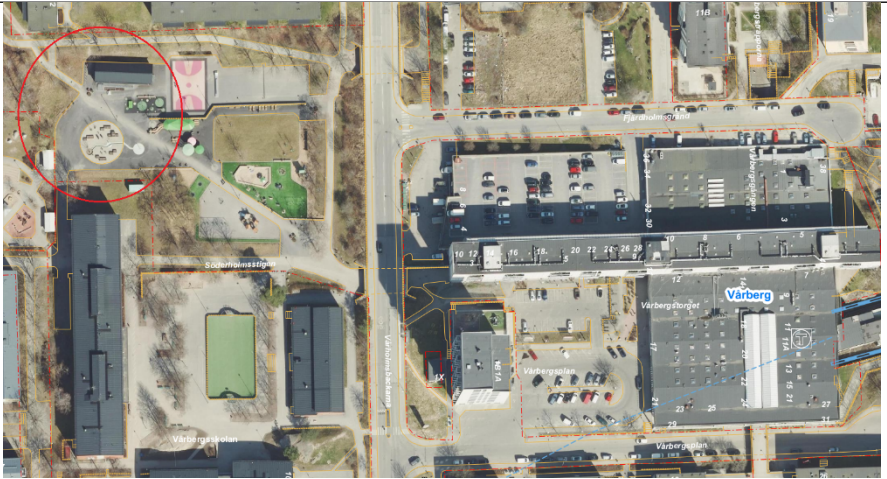


Projektname	<i>Förbättrad belysning Vårgården</i>
Geografisk plats för investering	<i>Parkleken Vårgården, Vårberg</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Sammanfattning från projektets ansökan:</p> <p>Parkleken Vårgården är en bemannad park i Vårberg i närheten av Vårbergs centrum. Parken genomgick en omfattande upprustning 2018-2020, med specifik ljusprojektering för ökad trygghet. Såväl projektering som belysningsåtgärder genomfördes under upprustningen 2018-2020, men bedöms i dagsläget tyvärr som otillräckliga för platsen. Ytor i behov av ökad belysning har konstaterats (se problembeskrivning). Se ett exempel på bild nedan. Förvaltningen avser nu komplettera dessa ytor i parken med anläggning av belysningsmast, samt eventuellt tillkommande armaturer på befintliga belysningsmaster. De åtgärder som ansöks om gäller mörka ytor i parkens utkant, som inte belystes inom upprustningen 2018-2020.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Efter genomförd investering är tidigare mörka ytor i parken är bättre upplysta, vilket bedöms påverka tryggheten positivt.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Tilldelade medel 500 tskr, ekonomiskt utfall 452 tskr. Projektet blev något mindre kostsamt än ansökan.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



