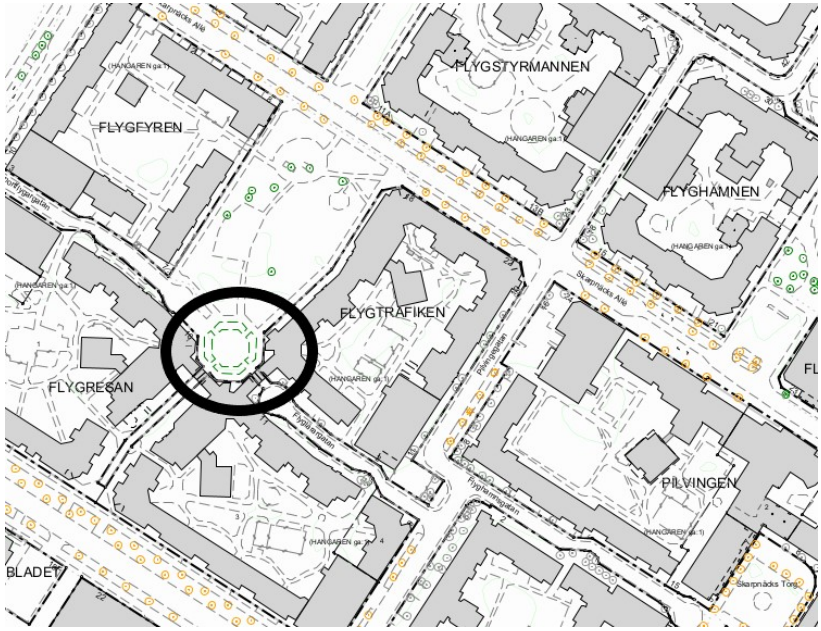


<b>Projektname</b>	Parkyta vid Sportflygargatan
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Adress och stadsdelsområde</i> Sportflygargatan, Skarpnäck
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Det aktuella området i Skarpnäcks stadsdel (Skarpnäcks torg och de angränsande gårdarna) har under det senaste året präglats av otrygghet på grund av försäljning av narkotika och en del skjutningar och sprängningar har ägt rum. På en vandring som genomfördes i maj 2023 där Stockholmshems gårdar var i fokus pekades även denna yta ut som i behov av upprustning. Ytan angränsar till Stockholmshems bestånd men är parkmark.</p> <p><a href="https://www.mitti.se/nyheter/har-visar-de-politiker-och-hyresvard-gardarnas-forfall-6.3.87913.4f3e0d8c42">https://www.mitti.se/nyheter/har-visar-de-politiker-och-hyresvard-gardarnas-forfall-6.3.87913.4f3e0d8c42</a>.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Platsen har rustats upp genom att återskapa samma karaktär som tidigare. Det har lagts nya plattor, parkträdens grenar har beskurits, ny kantsten har lagts, en blomsterurna har bytts ut till en permanent planteringsyta med biokol i två våningar. Även rabatterna har förstärkts med biokol. Ytan har blivit mer öppen och trivsamt, upplevs som tryggare och säkrare. Den bidrar till känslan av en finare utemiljö som gör att fler vill vistas på platsen och använda de intilliggande stråken.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Flytt av brunn och ledning behövde göras. Under plattytan var det fullt av rötter vilket försvårat arbetet så att utförandet blivit förlängt tidsmässigt. Plattorna gick inte att återanvända utan fick bytas ut.</p> <p>Schakt och läggning av kabelrör som utförts för dragning av er utgick och fick göras om. Då trafikkontoret som ansvarar för belysning på stadens offentliga platser inte vill ha belysning i marknivå då det är utsatt för vandalisering och kan bli en fara för allmänheten.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Nämnden erhöll 1,5 mnkr i budgetjustering och utfallet blev 1,5 mnkr.

**Bilder före**

*Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*



**Bilder efter**

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

