

Genomförandebeslut gällande projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp, fastigheten Svenska Högarna 3

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp i enlighet med utlåtandet till en projektutgift som framgår av bilaga till utlåtandet.
2. Utgifterna för år 2025 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2026.
3. Avsteg från närhetsprincipen godkänns för Gränsbergets idrottshall.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en hyra som framgår av bilaga till utlåtandet till följd av projektet.

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom

Sammanfattning av ärendet

Projektet Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp innebär att en fullstor idrottshall uppförs intill Skarpnäcks skola i stadsdelen Kärrtorp som tillhör Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde. Hallen kommer att kunna nyttjas av både skolor för idrottsundervisning och av föreningar. Idrottshallen kommer byggas i två våningar. Gränsbergets bollplan, tidigare kallad Skarpnäcks bollplan, som ligger precis intill, planeras också att rustas upp i ett separat projekt.

Beredning

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret ser positivt på uppförande av en ny idrottshall på platsen då den fyller en funktion för både skolidrotten men även för föreningslivet.

Stadsledningskontoret anser att projektkostnaden är hög givet vissa omständigheter och att en tydligare kostnadskontroll är önskvärd.

Föredragande borgarrådens synpunkter

Stockholm har ett stort underskott på idrottsanläggningar, vilket påverkar både föreningsliv och skolidrott negativt. Därför är vi stolta över att staden nu prioriterar idrottsinvesteringar och håller en hög byggtakt för nya anläggningar.

Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp är ett välkommet tillskott och kommer att bidra till att möta det stora behovet i stadsdelen och i söderort. Hallen planeras inrymma inte bara själva idrottsytorna utan även viktiga funktioner som föreningskafé, teorirum och uthyrningsbart kansli. Den parallella upprustningen av den intilliggande bollplanen gör också att fler funktioner kan användas gemensamt, till exempel kommer omklädningsrummen kunna ombesörja båda ytorna.

Att hallen byggs inom ramen för gällande detaljplan och på mark som idag nyttjas ineffektivt är också positivt. Det bidrar till att hålla nere stadens investeringskostnader, vilket är särskilt viktigt i det omvärldsläge vi befinner oss i. Samtidigt ser vi med viss oro på de ökade kostnaderna i projektet och vill därför betona vikten av noggrann kostnadskontroll under hela genomförandet.

Vi ser fram emot att Gränsbergets idrottshall kan stå färdig och tas i bruk i slutet av 2026, som ett konkret steg mot en mer jämlik tillgång till idrott i hela staden.

Bilaga

Bilaga - Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 2025/483-1.2

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 4 juni 2025

Karin Wanngård
Kommunstyrelsens ordförande

Reservation av Linnéa Vinge (SD) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen bifaller delvis tjänsteutlåtandet
2. Därutöver anföra följande:

I grunden ser vi positivt på uppförandet av Gränsbergets idrottshall, då det möter behovet av fler idrottsanläggningar för både skolor och föreningsliv. Samtidigt väcker det viss oro att projektet inte inkluderar någon ytterligare parkering, bortsett från platser för driftpersonal och personer med funktionsnedsättning. I tjänsteutlåtandet anges att besökare förväntas ta sig till platsen till fots, med cykel eller kollektivtrafik, vilket i teorin är en god ambition – men i praktiken riskerar att skapa utmaningar.

Det blir särskilt relevant med tanke på att staden i närliggande område, Kärrtorp 1:1 m.fl. vid norra delen av Holmögaddsvägen, har beslutat om bostadsbebyggelse på plats där det tidigare fanns en etablerad parkeringsyta. Samtidigt sker alltså en utveckling av både bostäder och idrottsanläggning i ett område där tillgången till parkering redan är begränsad.

Vi menar att detta sammantaget riskerar att leda till bristande tillgänglighet för boende, föreningar, skolpersonal och besökare till området. Det är därför rimligt att utreda möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning till idrottshallen eller i dess närhet för att säkerställa god framkomlighet och undvika framtida trängsel.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2022 fick idrottsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden i uppdrag att peka ut fyra platser där så kallade enkla hallar kan byggas i staden. Med enkla hallar menas att idrottshallen byggs enligt standard för hallar med tids- och kostnadseffektiva lösningar och material. En av de platser som pekades ut var intill Skarpnäcks skola, fastighetsbeteckning Svenska Högarna 3.

Projektet innebär att en fullstor idrottshall uppförs på platsen. Hallen kommer att kunna nyttjas av både skolor för idrottsundervisning och av föreningar. Idrottshallen kommer byggas i två våningar där det undre våningsplanet kommer innehålla ett motionsrum, bokningsbart föreningskafé, bokningsbart teorirum, uthyrningsbart kansli samt service- och driftytor. På hallens nedre våning kommer åtta omklädningsrum att byggas. Fyra av dessa ska vara möjliga att nyttja för verksamheten på bollplanen intill, Gränsbergets bollplan, (tidigare kallad Skarpnäcks BP) som planeras att rustas upp i ett separat projekt. Det övre våningsplanet innehåller idrottshallen samt idrottsförråd.

Idrottshallen planeras att nyttjas dagtid av Skarpnäcks skola och Skarpnäcks gamla skola. Idrottshallen ska upplåtas genom timbokning till de skolor som planeras enligt samplanering. Avsteg från ordinarie närhetsprincip som annars gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid kan göras genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen.

Enligt projektets tidplan ska produktionen inledas under det andra kvartalet 2025 och slutföras under det fjärde kvartalet 2026.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 mars 2025 följande.

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en projektutgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Reservation av Sergej Salnikov (SD), se Reservationer m.m.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 mars 2025 följande.

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa genomförande av projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp till en projektutgift redovisad i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i

Kärrtorp, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden.

3. Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsteg från närhetsprincipen för Gränsbergets idrottshall.
4. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.

Reservation av Leif Söderström (SD), se Reservationer m.m.

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2025 har i huvudsak följande lydelse.

Bakgrund

Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret fick under år 2022 i budgetuppgift att peka ut fyra platser för enkla hallar i staden, det vill säga idrottshallar enligt standard för hallar med tids- och kostnadseffektiva lösningar och material. En av de platser som förvaltningarna bedömde som lämplig var intill Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola, som är en del av fastighet Svenska Högarna 3. På platsen finns idag en före detta vaktmästarbostad, upplåten till SISAB med tomträtt, och platsen är detaljplanelagd för allmänt ändamål. Vaktmästarbostaden behöver rivas för att möjliggöra projektet. Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har fört dialog med SISAB och utbildningsförvaltningen, som är eniga om att platsen är lämplig för en ny idrottshall som kan nyttjas för skolidrott samt föreningsidrott.

Idrottsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av fler idrottshallar i stadsdelområdet. Bedömningen görs utifrån identifierade behov i anläggningsstrategin samt den förväntade befolkningsutvecklingen. Idrottshallen planeras att nyttjas dagtid av Skarpnäcks skola och Skarpnäcks gamla skola. Idrottshallen ska upplåtas genom timbokning till de skolor som planeras enligt samplanering. Avsteg från ordinarie närhetsprincip som annars gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid kan göras genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen.

Under 2024 upphandlade fastighetskontoret ett ramavtal för uppförande av idrottshallar i strategisk samverkan. I samverkansentreprenader avtalas det specifikt om hur hantering och strävan mot gemensam målstyrning, gemensam riskhantering, konfliktlösningsmetoder och kontinuerlig uppföljning och förbättring. Gränsbergets idrottshall kommer att uppföras inom detta ramavtal.



Översiktsskild, aktuell plats för ny idrottshall markeras med gul cirkel.

Tidigare beslut

Utredningsbeslut fattades i fastighets- respektive idrottsnämnd den 3 mars 2023. Ärendet benämndes då *Ny idrottshall intill Skarpnäcks BP, Skarpnäcks gård 1:1*. Nu benämns det *Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp, Svenska Högarna 3*.

Inriktningsbeslut fattades i fastighets- respektive idrottsnämnden den 28 maj 2024.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Samråd gällande genomförandebeslut har skett med stadsledningskontoret 2025-02-17 och 2025-02-28.

Beskrivning av projektet

Projektet innebär uppförande en ny fullstor idrottshall i Kärrtorp, intill Skarpnäcks skola, för nyttjande av skolor och föreningsidrott. Idrottshallen har fått namnet Gränsbergets idrottshall.

Idrottsanläggningen innehåller ett motionsrum med tillhörande förråd, bokningsbart föreningskafé, bokningsbart teorirum, uthyrningsbart kansli samt service- och drifttytor. Idrottshallen uppfyller de krav som ställs på en fullgod tränings- och tävlingshall inom ett brett spann av idrotter och utformas därefter. Därtill ska idrottshallen fungera för idrottsundervisning av närliggande skolor. Den nya idrottshallen innehåller totalt åtta omklädningsrum, fyra av dessa ska vara möjliga att nyttja för verksamhet på den planerade konstgräsplanen intill. Samtliga omklädningsrum kan nyttjas till idrottshallen vid behov.


Då projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan kan utformning och effektivisering av ytor och installationer fortsatt komma att ske inom projektets ramar.

Det krävs nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder i och med att marken idag upplåts av exploateringsnämnden till SISAB med tomträtt innan byggnation kan påbörjas. Arbete med fastighetsreglering pågår.


Den nya idrottshallen och Skarpnäcks skola kommer att samnyttja befintlig angoringsgata, vilken anpassas för att förbättra trafiksäkerhet och skapa tydliga stråk. Ett fristående miljöhus ska också uppföras på platsen för samnyttjande. Utredning pågår för att säkerställa hur ansvar och ägande fördelas mellan parterna.

Idrottshallen bedöms kunna uppföras på gällande detaljplan (PL3896) som anger allmänt ändamål med en begränsning i byggnadshöjd om 13 meter från medelmarknivå.


God tillgänglighet i och till byggnaden samt parkeringsmöjligheter för driftpersonal och funktionsnedsatta besökare tillskapas invid idrottshallen. Ingen övrig parkering skapas. Idrottshallens främsta upptagningsområde är lokalt och besökare förväntas ta sig till hallen via kollektivtrafik, cykel eller till fots. Plats för hämtning och lämning hänvisas till befintlig gatustruktur. Nyttjare av idrottshallen är idrottsföreningar och skolor i närheten. Utbildningsförvaltningen ämnar boka idrottshallen för den schemalagda idrottsundervisningen.

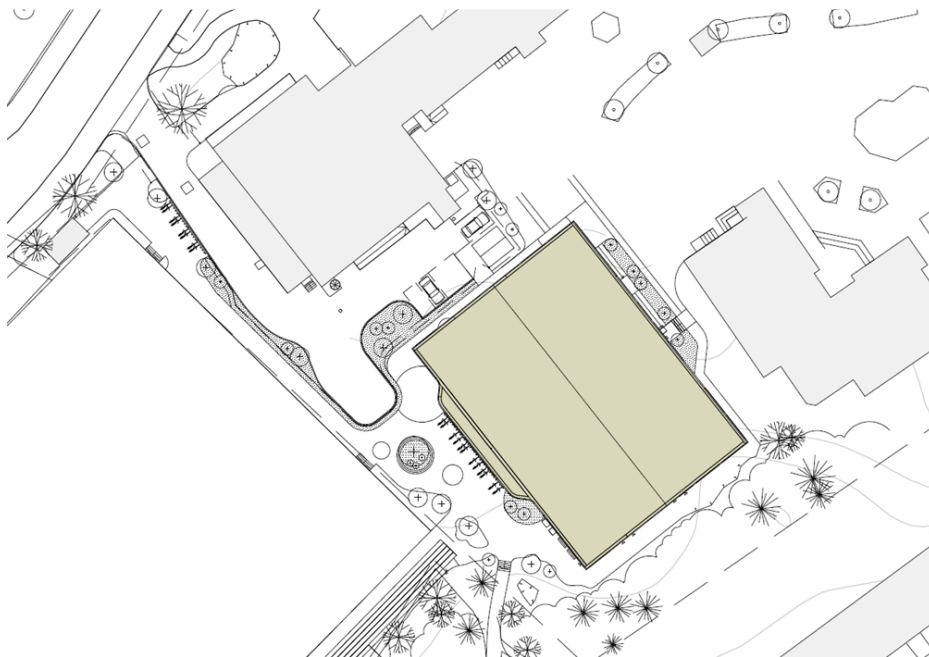


Situationsplan som visar Gränsbergets idrottshall samt justerad angoringsväg som betjänar befintliga funktioner till Skarpnäcks skola samt till den nya idrottshallen. Mindre justeringar kan komma att göras i kommande fas.

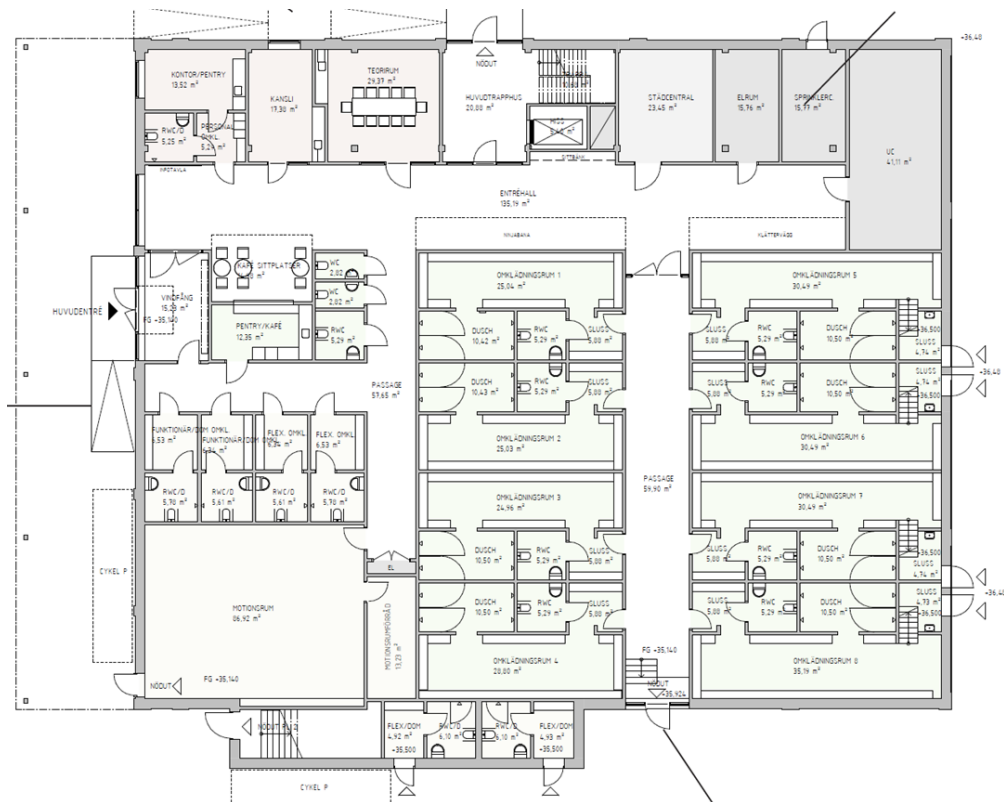

Planritning, plan 1. På entréplan finns omklädningsrum, lokaler för drift, teknik och personal, föreningslokaler, motionsrum. Mindre justeringar kan komma att göras i kommande fas.

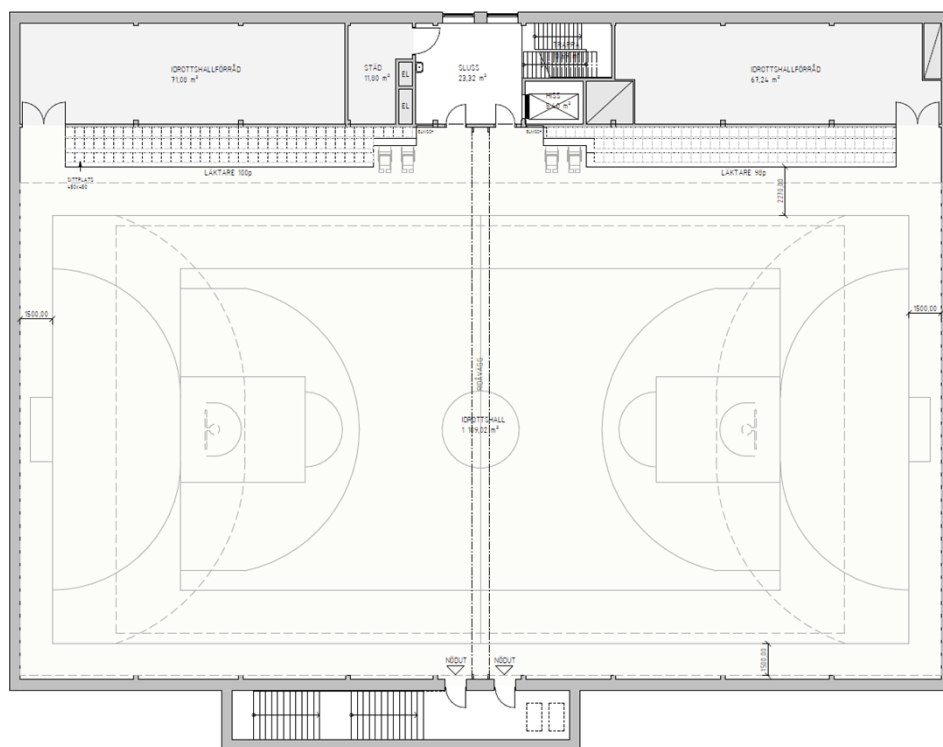

Planritning, plan 2. På våningen finns idrottshallen med läktare och förråd. Mindre justeringar kan komma att göras i kommande fas.

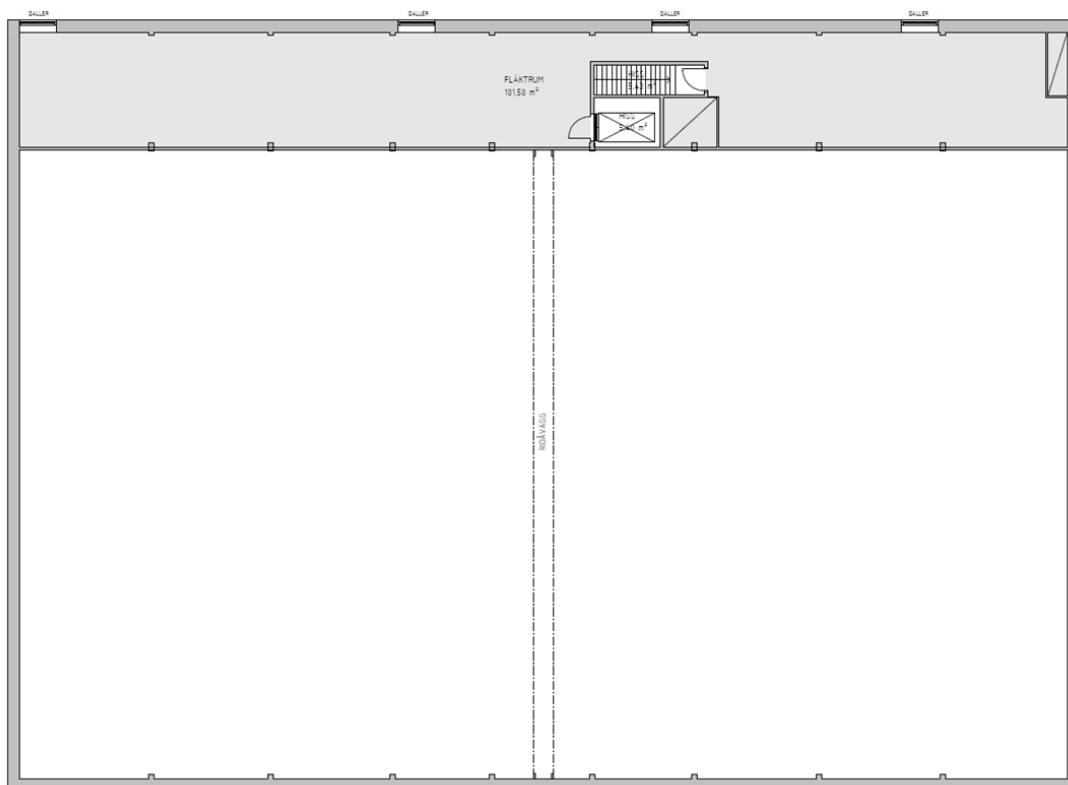

Planritning för plan 3. På våningen finns drift- och tekniktor i anslutning till trappa och hiss. Mindre justeringar kan komma att göras i kommande fas.

Sedan inriktningsbeslut

Sedan inriktningsbeslut togs i respektive nämnd har ett ramavtal upphandlats av fastighetskontoret för uppförande av idrottshallar i samverkan. Gränsbergets idrottshall kommer att genomföras inom ramen för detta ramavtal. Inledande workshops har hållits tillsammans med entreprenören och samverkansarbete har påbörjats för att ta fram handlingar inför kommande produktion. SISAB har erbjudit en ersättningsbostad till hyresgästen i den före detta vaktmästarbostaden som denne accepterat.

Hållbarhet och kvalitet

Barnrättsperspektiv

Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrättsperspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. Projektet berör barn i närområdet, elever på Skarpnäcks skola och i staden i stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper samt bokas för schemalagd skolidrottsundervisning.

Projektet har genomfört en integrerad barnkonsekvensanalys där återkoppling från dialoger kring barnens perspektiv och barnperspektiv löpande har arbetats in i projektet.

Jämställdhet och jämlikhet

Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda duschbås. Det skapas även flexomklädningsrum. Idrottshallen och motionsrummet skapar tillsammans en stor flexibilitet för möjliga idrotter och aktiviteter.

Miljökonsekvenser

Projektet ska följa stadens miljöprogram och ha en projektanpassad miljöplan. Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår nivå Miljöbyggnad silver.

Projektet förväntas inte försämra områdets förmåga att hantera skyfall. Platsen är inte en lågpunkt. Dagvatten hanteras lokalt genom anpassad höjdsättning och dagvattenåtgärder såsom planteringar.

Projektet utreder byggnation med miljösmarta materialval vid till exempel val av stomme. En solcellsanläggning planeras på idrottshallens tak och dimensioneras för 80 % av egenförbrukningen, vilket kommer leda till en minskad mediakostnad tack vare produktion av förnybar el. Solcellsanläggningen planeras också förberedas för att kunna utökas i framtiden om behov uppstår. Projektet har utrett eventuell försäljning av eventuell överproduktion till SISABs intilliggande skola. Beslut har tagits att detta inte är aktuellt i nuläget, men möjlighet finns för utveckling i framtiden.

Undercentralen kommer förberedas för att möjliggöra att ta tillvara på potentiell spillvärme från den planerade kylmaskinen som ska förse Gränsbergets BPs (före detta Skarpnäcks BP) ispist med kyla.

Tillgänglighet

Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i projektet för att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls.

Trygghet och säkerhet

Befintlig angöringsväg, för bland annat matleveranser till skolan, justeras för att kunna rymma fler funktioner och målpunkter. Justeringarna innebär att en säkrare trafiksituation skapas. Vilka ytor som är ämnade för fotgängare, cyklister respektive bilar och leveranser tydliggörs. Därtill minskas mängden möten mellan de olika transportsätten.

Investerings mål och syfte

Målet med projektet är att uppföra en fullstor idrottshall för nyttjande av Stockholms medborgare som uppfyller de av verksamhet och förvaltningar uppsatta kraven.

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid* genom att tillföra en ny idrottshall i stadsdelsområdet.

Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande*

i förskolan och skolan genom att utbildningsförvaltningen ämnar boka hallen för schemalagd idrottsundervisning samt Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att öka antalet bokningsbara timmar för idrotts- och föreningsliv.

Kommunikation

En kommunikationsplan och en aktivitetsplan ska tas fram. Förutom idrottsförvaltningen som är hyresgäst berörs skola, närboende samt verksamheter i området.

Tidplan

Genomförandebeslut mars 2025

Genomförandebeslut KF Q2 2025

Produktionsstart Q2 2025

Projekt klart Q4 2026

Ekonomi

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med slutredovisning för nämnd presenteras all information.

Risker och möjligheter

Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna och möjligheter för projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.

Risker

- Förseningar i tidplan på grund av till exempel
- bygglovshandläggning och fastighetsreglering, då de fastighetsrättsliga dimensionerna inte är fastställda ännu.
- Förseningar på grund av leveranstider av material och byggdelar.
- Markförhållanden kräver både pålning och sprängning.
- Att uppföra en idrottshall i direkt anslutning till skola kräver fysiska avgränsningar och noggrann produktionsplanering. ☐ Lösning för anslutningspunkter för vatten och avlopp utreds.

Möjligheter

- Tillskapa en idrottshall samt motionsrum för Stockholms medborgare, föreningsliv och skola.
- Möjligheter för ett fungerande föreningsliv med bokningsbart teorirum och föreningskafé. Därtill uthyrningsbart kansli.
- Gällande detaljplan för allmänt ändamål med byggrätt kan nyttjas, ingen detaljplaneläggning krävs.
- Bra kollektivtrafik till platsen.
- Idrottshallen kan innehålla omklädningsrum till Gränsbergets BP.
- Ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning i direkt anslutning till befintlig skola. Utbildningsförvaltningen ämnar boka idrottshallen för den schemalagda idrottsundervisningen.

Förvaltningarnas analys

Utveckling med en fullstor idrottshall i Kärrtorp kommer att leda till ökade möjligheter för föreningsidrott och skola att bedriva idrottsverksamhet. Projektet kan bedrivas tidseffektivt då detaljplaneändring inte krävs. Gränsbergets idrottshall kommer att bli ett värdefullt tillskott med hänsyn till behovet av idrottshallar i stadsdelsområdet.

Plan för uppföljning

Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med lägesrapport under entreprenadtiden och slutrapport när projektet är avslutat.

Remissammanställning

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2025 har i huvudsak följande lydelse.

En ny idrottshall i Skarpnäck bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*. Projektet kommer även förbättra möjligheterna för skolidrott. I och med det bidrar projekten till kommunfullmäktiges mål *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan*.

Stadsledningskontoret ser positivt på uppförande av en ny idrottshallen på platsen. Hallen kommer fylla en funktion för både skolidrotten men även för föreningslivet. Att den intilliggande bollplanen rustas upp kommer att ge goda synergieffekter. Till exempel kommer vissa av idrottshallens omklädningsrum att kunna nyttjas av bollplanens verksamhetsutövare. Vidare byggs idrottshallen med stöd av gällande detaljplan på mark som inte används effektivt idag.

Stadsledningskontoret anser att projektkostnaden är hög givet vissa omständigheter. Stadsledningskontoret har med anledning av den höga projektkostnaden begärt ett förstärkt samråd inför genomförandebeslutet. Underlaget har därefter kompletterats för att ge en bättre förklaring till varför kostnaderna är så pass höga.

Det som framkommer som fördyrande omständigheter är att både sprängning och pålning är aktuellt till följd av markförhållandena. Ett nytt miljöhus kommer att byggas som även skolan kommer att nyttja och senare även betala för.

Stadsledningskontoret anser att vissa frågor med fördel bör vara mer utredda vid tidpunkten för genomförandebeslut och en tydligare kostnadskontroll är önskvärd.

Reservationer m.m.

Fastighetsnämnden

Reservation av Sergej Salnikov (SD)

Sergej Salnikov (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att delvis bifalla fastighetskontorets förslag till beslut
2. Att uppdra åt fastighetskontoret att i samverkan med exploateringsnämnden och trafiknämnden utreda möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning till idrottshallen eller i dess närhet.
3. Att därutöver anföra följande:

I grunden ser vi positivt på uppförandet av Gränsbergets idrottshall, då det möter behovet av fler idrottsanläggningar för både skolor och föreningsliv. Samtidigt väcker det viss oro att projektet inte inkluderar någon ytterligare parkering, bortsett från platser för driftpersonal och personer med funktionsnedsättning. I tjänsteutlåtandet anges att besökare förväntas ta sig till platsen till fots, med cykel eller kollektivtrafik, vilket i teorin är en god ambition – men i praktiken riskerar att skapa utmaningar.

Det blir särskilt relevant med tanke på att staden i närliggande område, Kärrtorp 1:1 m.fl. vid norra delen av Holmögaddsvägen, har beslutat om bostadsbebyggelse på plats där det tidigare fanns en etablerad parkeringsyta. Samtidigt sker alltså en utveckling av både bostäder och idrottsanläggning i ett område där tillgången till parkering redan är begränsad.

Vi menar att detta sammantaget riskerar att leda till bristande tillgänglighet för boende, föreningar, skolpersonal och besökare till området. Det är därför rimligt att utreda möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning till idrottshallen eller i dess närhet för att säkerställa god framkomlighet och undvika framtida trängsel.

Idrottsnämnden

Reservation av Leif Söderström (SD)

Se reservation anford av Sergej Salnikov (SD) under fastighetsnämnden.
