

Handläggare

Frank Vanberg
Telefon: 0850827079

Till

Fastighetsnämnden
2023-05-23

Maria Klavdianou Lundell
Telefon: 08-508 276 09

Idrottsnämnden
2023-05-23

Ny multihall på Vårbergs IP, del av Skärholmen 2:1

Utredningsbeslut

Fastighetskontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet.
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för Ny multihall på Vårbergs IP som underlag till kommande inriktningsbeslut, med en beräknad utredningsutgift upp till 45 mnkr.
3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner förslag till utredning.

Idrottsförvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet för projekt Ny multihall på Vårbergs IP.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för Ny multihall på Vårbergs IP som underlag för kommande inriktningsbeslut till en utredningsutgift upp till 45 mnkr.

Sammanfattning

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner i området. Vårbergs IP utvecklas till en mer komplett anläggning där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Idrottsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för boende i närområdet.

Vårbergs IP är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, som syftar till att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Genom att bygga minst 4 000 nya bostäder, skolor, förskolor, parker, idrottsplatser och kulturverksamheter kan området utvecklas till en trygg och levande stadsdel.


På idrottsplatsen föreslås uppförande av en ny anläggning bestående av en multihall samt ytor för spontanidrott. Multihallen består av en teknikhall för fotboll, med mått för stor 7-spelsplan, samt funktioner för friidrott, fullstor idrottshall för inomhusidrotter som handboll, innebandy, basketboll, volleyboll, skolidrott, plus boulebanor, samt en fritidsgård i stadsdelsnämndens regi utreds. I hallen ska det även finnas bokningsbara flexibla mötes/motionsrum, förråd, omklädningsrum, café, mindre föreningskanslier med mera.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avser att återkomma med underlag för inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 45 mnkr, varav 9,6 mnkr är upparbetade hittills. Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförandet av projektet kommer vara möjligt att finansieras inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar för 2023 och inom den utökade investeringsramen för 2024-2026. Projektet bedöms vara färdigt Q1 2028. Projektet fokuserar på att hålla nere investeringskostnaden, för att idrottsförvaltningen ska få en låg självkostnadshyra.

Ärendet

Bakgrund

Vårbergs IP är belägen på del av fastigheten Skärholmen 2:1, i sydvästra delen av Stockholm. Vårbergs IP anlades under åren 1975-1976 och är belägen längs med Vårbergsvägen i stadsdelen Vårberg. Idrottsplatsen består idag av bland annat tre konstgräs-fotbollsplaner, en uttjänt ishockeyrink, tekniksegment som höjdhopp, längdhopp och kula, spontanidrottsyta, servicebyggnader, förråd, omklädningsrum, servering, allmänhetens toaletter, domarum samt klubbtrymmen. I slutet av 2010 togs ett beslut om ett start-PM avseende planläggning av Vårbergs IP och 2014-01-11 vann den nya detaljplanen för idrottsplatsen laga kraft.

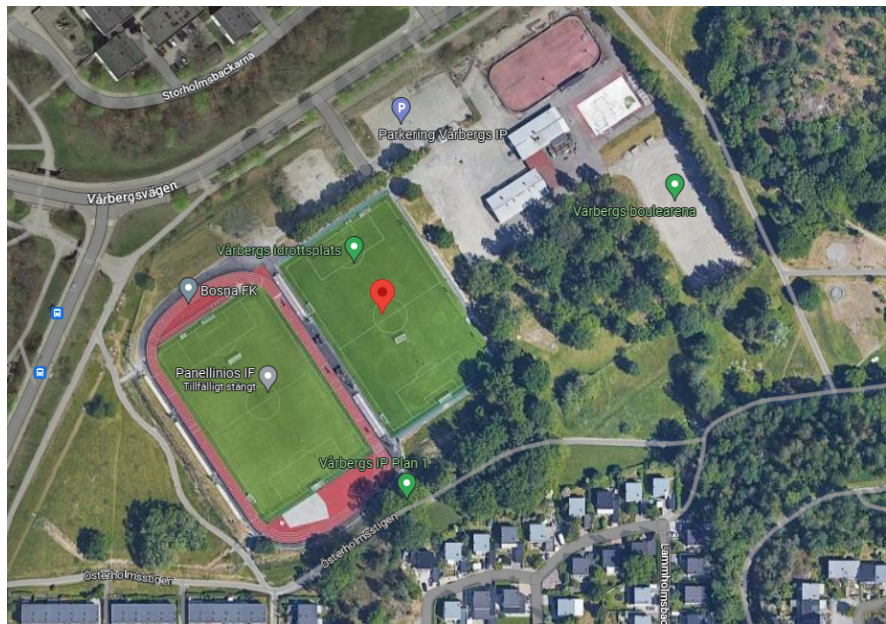

Vårbergs IP. Foto google maps

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottsbodar och konstgräsplaner i området. Vårbergs IP utvecklas till en mer komplett anläggning där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Idrottsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för boende i närområdet.

Utvecklingen av Vårbergs idrottsplats påbörjades 2018 med att den dåvarande grusplanen fick konstgräs och den gamla konstgräsplanen fick nytt konstgräs. 11-spelsplanerna fick ny belysning och läktare. Runt en av spelplanerna finns en rundbana för skolfriidrott.

Under 2023 färdigställs en mindre 7-spelplan med konstgräs. Planen får måtten 55 x 36 meter och är placerad sydväst om 11-spelsplanerna. Den öppna gräsytan intill 7-spelsplanen anpassas med en fördjupning för att kunna samla upp stora mängder vatten vid skyfall. Marken planteras med äng för att bidra till den biologiska mångfalden.

Genomförandebeslut har fattats om att uppföra en servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, tvättstuga och teknikutrymmen som kan nyttjas av de som använder utomhusytorna.

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Parkeringen vid Vårbergs idrottsplats förbättras och utökas till 60 parkeringsplatser. Hälften av platserna får laddstolpar för elbilar. Ett samarbete pågår med stadsdelsförvaltningen om att inrymma

lokaler för en fritidsgård, i stadsdelsförvaltningens regi, som planeras få en idrottsprofil.


Ärendets beredning

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret den 18 april 2023.

Beskrivning av projektet

En detaljplan finns framtagen för Vårbergs IP där multihall, servicebyggnad, fotbollsplaner med mera är inkluderad (DP 2010–14752). På Vårbergs IP föreslås uppförande av en ny anläggning bestående av en multihall samt ytor för spontanidrott. Multihallen består av en teknikhall för fotboll (7-spelsplan) samt funktioner för friidrott, fullstor idrottshall för inomhusidrotter som handboll, innebandy, basketboll, volleyboll, gymnastik, skolidrott, plus boulebanor, samt en fritidsgård i stadsdelsnämndens regi ska utredas. I hallen ska det även finnas bokningsbara flexibla mötes/motionsrum, förråd, omklädningsrum, café, mindre föreningskanslier med mera.

I utomhusmiljön kommer ytor för spontanidrott, för exempelvis basket, isbana, utegym, lekplats och motorikbana, skapas som ett tillskott för stadsdelen samt en motionsslinga.

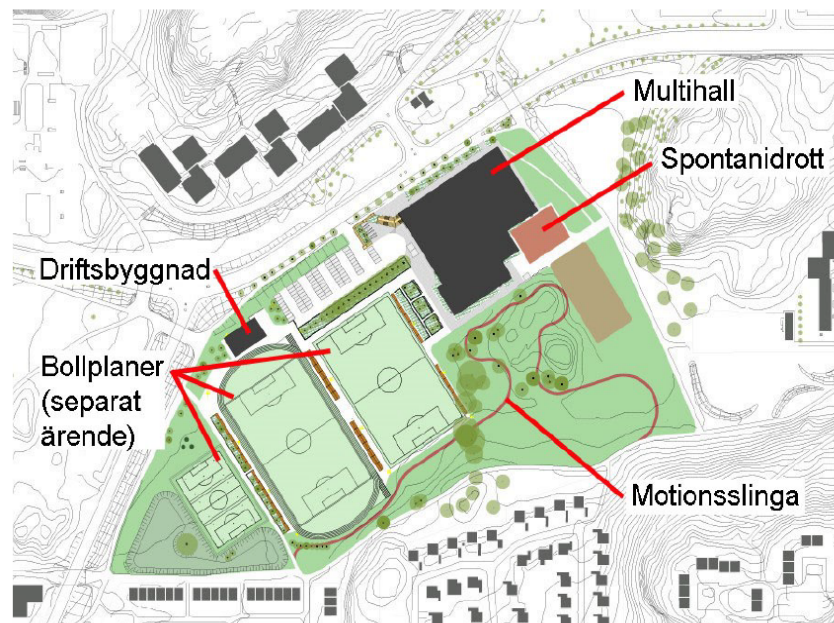

Situationsplan Vårbergs IP

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Tidigare beslut

Samtliga tidigare beslut har avsett hela projektet för utveckling av Vårbergs IP där servicebyggnaden ingått.

Utredningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden i mars 2016 (FSK Dnr 4.1-071/2016, IDF Dnr 08.01.01/241/2016).

Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden i januari 2017 (FSK Dnr 4.1-071/2016, IDF Dnr 08.01.01/241/2016).

Inriktningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden i maj 2018 (FSK Dnr 2017/00103, IDF Dnr 08.01.01/241/2016).

Efter inriktningsbeslutet 2018 beslutades av dåvarande majoriteten att multihallen skulle uppföras av privat aktör, därför har nedan projekt brutits ut ur de tidigare besluten som gällde för hela Vårbergs IP. Multihallen har nu återigen övergått till att uppföras i kontorets regi.

- FSK Dnr 2022/313 Ny servicebyggnad på Vårbergs IP.
- FSK Dnr 2018/385 Nybyggnad av konstgräsplaner och torrdamm.
- FSK Dnr 2020/600 7-spelsplan och torrdamm.

Mål och syfte

Syftet med projektet är att uppföra en multihall på Vårbergs IP för att tillskapa ytterligare funktioner på idrottsplatsen och möjliggöra ett utökat idrottsutövande.

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Alla stockholmarna ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv* genom att tillskapa en ny multihall så ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott och delta i föreningsliv.

Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.*

Barn och ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Projektets genomförande bidrar till samhällsnytta genom att den nya idrottsplatsen kan fungera som en länk mellan föreningslivets organiserade idrottsverksamheter och det egna eller spontana idrottandet samt potential att nå ut till prioriterade målgrupper.

Hållbarhet och kvalitet

Projektet kommer att ha fokus på att begränsa driftkostnaderna för staden, genom att bland annat utreda:

- Anläggande av solceller
- Tillskapande av gröna tak där så är möjligt

Idrottsstandard för idrottsanläggningar när det gäller funktioner, volymer och prestanda för exempelvis idrottshallar och ska vara styrande i kommande projekt.

Preliminär tidplan

Utredningsbeslut	Q2 2023
Inriktningsbeslut	Q2 2024
Genomförandebeslut	Q1 2025
Produktionsstart	Q1 2026
Projektavslut	Q1 2028

Ekonomi

Utgifter för hittills nedlagda utgifter uppgår till 9,6 mnkr för flytt av ledning i gatan kopplat till stadens pågående projekt med Vårbergsvägen. I utredningsutgiften om 45 mnkr ingår ett riskpåslag för att hantera eventuella behov av ytterligare utredningar inom utredningsfasen. Utredningsutgiften är en uppskattning och kontoren kommer enbart genomföra nödvändiga undersökningar och ta fram erforderliga handlingar inför ett kommande inriktningsbeslut. Eventuellt kommer inte hela utredningsbudgeten att nyttjas.

I fastighetsnämndens investeringsbudget kommer utgifter för kommande utredningar att inrymmas.

Utredningarna syftar till att ta fram en reviderad programhandling för multihallen för att kunna säkerställa en tidig kalkyl och utgöra ett tillräckligt bra underlag för ett inriktningsbeslut. Förvaltningarna kommer även att analysera behovet av tillfälliga omklädningsrum.

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Det finns sedan tidigare framtagna programhandlingar. Dessa är dock 5 år gamla eftersom projektet har varit pausat under utredning att uppföra byggnaden av privat aktör. Därför behöver samtliga handlingar bearbetas och uppdateras efter nya lagkrav, kontorets tekniska anvisningar, verksamhetsbehov med mera.

Staden har ett nytt miljöprogram sedan 2020 som ställer krav på skyfallshantering, vilket behöver omhändertas i projektet. Det kommer även göras solcellsberäkningar och beräkningar av dagvattenhantering från tak, då det är en betydande yta. Klimatberäkningar på materialval för att utreda CO2-belastningen behöver tas fram. Projektet behöver även göra elförsörjningsutredningar, då det har konstaterats att det inte finns tillräckligt med el för att försörja idrottsplatsen. Troligen behöver ett högspänningsställverk att uppföras. Idrottsplatsen ligger inom fornminnesområde, varför en fornminnesutredning behöver upprättas.

Då det pågår flera projekt inom Skärholmen så behöver samordning av transporter ske med övriga byggherrar. Det behöver därför genomföras logistikutredningar, planering av temporära infarter med mera.

Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet kommer att överstiga 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk för stora investeringar behöver utredningsbeslutet beslutas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförandet av projektet kommer vara möjligt att finansieras inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar för 2023 och inom den utökade investeringsramen för 2024-2026.

Projektet bedöms vara färdigt Q1 2028. Projektet fokuserar på att hålla nere investeringskostnaden för att idrottsförvaltningen ska få en låg självkostnadshyra.

Förvaltningarna har under 2023 tagit fram en behovsanalys med identifierade behov. Behovsanalysen utgår från idrottsförvaltningens nyckeltal samt stadens strategi för idrottsanläggningar och från identifierade behov av kompletterande funktioner på idrottsplatsen. Se bilaga 1 Projektdirektiv för det samlade behovet från behovsanalysen.

Risker och möjligheter

Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska faktorer för att investeringen ska kunna genomföras i enlighet med beslut har identifierats:

Risk	Risikfaktor (låg/medel/hög)	Kommentar
Skyfalls/dagvattenhantering	Medel	Hårdgjorda ytor medför ökad risk, torrdamm anläggs i sydvästra delen.
Befintlig dagvattenledning på platsen för multihallsbyggnaden behöver flyttas	Hög	Risk för förseningar i projektet.
Markförutsättningar	Medel	Osäkerhet om ökade materialkostnader pga. inflation och världsläge.
Fornminne	Hög	Finns och behöver utredas.
Projekt ombyggnad av Vårbergsvägen pågår	Hög	Projektet behöver samordnas.

Barnrättsperspektiv

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför tas till barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas för idrottsanläggningar så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig på anläggningen, känna sig trygga och kan röra sig säkert.

En multihall innehåller möjligheten till många olika aktiviteter och ger därmed alla barn och ungdomar möjligheten att röra sig, utveckla sin hälsa samt finna rörelseglädje i en tillåtande och mångsidig anläggning. Då anläggningen blir fullt ut tillgänglighetsanpassad inkluderas också barn med olika funktionsvariationer på lika villkor.

Multihallen innebär att idrottsplatsen i sin helhet utvecklas för att möta och tillgodose alla barn och ungdomars behov på ett mer komplett sätt.

En barnkonsekvensanalys ska göras i nästa skede av projektet.

Tillgänglighet

Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads handbok *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*. Multihallen samt spontanytorna ska utformas så de blir fullt ut tillgängliga i alla delar där det är möjligt.

Jämställdhet och jämlikhet

Utvecklingen av idrottsplatsen genom byggnation av en multihall med möjlighet till många olika aktiviteter kommer att gynna både flickor och pojkar i alla åldrar. Multihallen tillgodoser flera olika idrotter. Genom att utveckla en flexibel och mångsidig anläggning, ökar möjligheten till en mer jämställd fördelning och användning.

Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar är generellt jämn. Exempelvis är basket den mest inbokade idrotten i stadens stora hallar och uppfyller målen för att anses vara en jämställd idrott. Fotboll är en av de största idrotterna för både flickor och pojkar, även om könsfördelningen bland nyttjare av fotbollsplaner är 75 procent pojkar och 25 procent flickor. Ytorna för spontanidrott som skapas ger förutsättningar för både flickor och pojkar att vara fysiskt aktiva. Genom att även skapa flex-omklädningsrum, tillförs möjligheter för enskild omklädning.

Förvaltningarnas synpunkter

Projektet är viktigt att genomföra då stadsdelen växer och ytterligare idrottsfunktioner behövs för att tillgodose behovet. Vårbergs IP är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, som syftar till att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner i området. Vårbergs idrottsplats utvecklas till en mer komplett anläggning, där fler barn och unga får möjlighet att idrotta både utomhus och inomhus. Idrottsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för boende i närområdet.

Vårbergs IP med ytterligare funktioner bidrar till en attraktiv mötesplats och målpunkt i området. Stadens intentioner är att skapa mervärde för områdets boende.

Slut

Bilagor

1. Projektdirektiv Ny multihall på Vårbergs IP

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Göran,Kindberg	2023-05-11
Britta Marina,Högländ	2023-05-11
