

## **Reviderat genomförandebeslut för projekt Herbariet i Liljeholmen**

Hemställan från exploateringsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra projekt Herbariet i Liljeholmen till en projektutgift om 71,1 mnkr och en projektinkomst om 4,6 mnkr.
2. Utgifterna för år 2026 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för år 2027.

### **Föredragande borgarrådet Karin Wanngård**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Projektet Herbariet avser genomförande av detaljplan för del av fastigheten Herbariet 2 i stadsdelen Liljeholmen. Detaljplanen möjliggör en grundskola, tre idrottshallar, en transformatorstation samt lokalgata, torg och naturmark.

Genomförandebeslut för projektet fattades av exploateringsnämnden år 2022. Den del av projektet som omfattar skola och idrottshallar färdigställdes år 2024 och är upplåten med tomträtt till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB .

Stadens arbeten i allmän plats har delats in i tre etapper. Etappindelningen i projektet har tillsammans med markföreningar, högre VA-anslutningskostnader och generella byggkostnadsökningar lett till ökade utgifter jämfört med det gällande genomförandebeslutet. Exploateringsnämndens återstående arbeten i projektet består av en entreprenad med ett torg och beräknas vara klart våren 2027.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas nu uppgå till cirka 77,1 mnkr och projektinkomsterna till cirka 4,6 mnkr. Lönsamhetskalkylen redovisar ett nettonuvärde om 9 mnkr, inklusive tidigare nedlagda nettoutgifter. Täckningsgraden uppgår till 111 procent.

Projektutgiften bedöms uppgå till över 50 miljoner kronor. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska genomförandebeslut i investeringsärenden som överstiger 50 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.

## Beredning

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

*Stadsledningskontoret* ser positivt på projektet Herbariet som bidrar till utveckling av stadsdelen Liljeholmen med idrottshallar, grundskola, torg och lokalgata.

## Föredragande borgarrådets synpunkter

Stora delar av projekt Herbariet är redan genomfört och det är positivt att den sista delen av projektet, entrétorget, nu kan slutföras. Jag förutsätter att inga ytterligare fördyringar sker.

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 19 augusti 2026

Karin Wanngård  
Kommunstyrelsens ordförande

**Särskilt uttalande** av Gulan Avci (L) enligt följande.

Gulan Avci (L) har beaktat det föredragande borgarrådets förslag till beslut och anför följande.

Projekt Herbariet tillför till området en ny grundskola, tre idrottshallar och en förbättrad stadsmiljö. Liberalerna har tidigare ställt sig bakom projektet.

Projektutgiften har emellertid ökat från 49 till 71,1 miljoner kronor, motsvarande drygt 45 procent. Fördyringen kan inte förklaras enbart av den allmänna kostnadsutvecklingen. Det är särskilt bekymmersamt att den etappindelning som sedermera bedömdes nödvändig för att genomföra projektet inte beaktades i den ursprungliga kalkylen. Omprojektering och fler entreprenadupphandlingar har därefter drivit kostnaderna ytterligare.

En del kostnader, såsom upptäckta markföroreningar och högre kostnader för VA-anslutning, kan ha varit svåra att förutse. Den samlade kostnadsökningen visar ändå på brister i den ursprungliga kalkylen och projektplaneringen.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att Stockholm ska kunna genomföra de investeringar som staden behöver. Tidiga kalkyler måste bygga på realistiska antaganden och risker måste synliggöras. Erfarenheterna från Herbariet bör tas till vara i kommande investeringsprojekt.

## Ärendet

Projektet Herbariet avser genomförande av detaljplan för del av fastigheten Herbariet 2 i stadsdelen Liljeholmen (Dp 2021-01105), som vann laga kraft den 18 juli 2022. Projektområdet ligger invid Midsommarkransens gymnasium vid Essingeleden och Södertäljevägen. Detaljplanen möjliggör en grundskola, tre idrottshallar, en transformatorstation samt lokalgata, torg och naturmark.

I juni 2021 ingick staden en avsiktsförklaring med Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB om att bolaget skulle ta i anspråk delar av SISAB:s tomträtt, bygga skol- och idrottslokaler samt renovera Brännkyrkahallen. Enligt avsiktsförklaringen skulle staden hyra idrottslokalerna, Internationella Engelska Skolan skulle hyra skollokalerna och Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB skulle förvärva och renovera Brännkyrkahallen.

Genomförandebeslut för projektet fattades av exploateringsnämnden den 12 maj 2022. De totala projektutgifterna beräknades då uppgå till 45,3 mnkr och projektinkomsterna till 3,7 mnkr. Lönsamhetskalkylen redovisade ett nettonuvärde om 14 mnkr och täckningsgraden uppgick till 121 procent.

I samband med kommunfullmäktiges budget för 2023 beslutades att den planerade lösningen för Brännkyrkahallen skulle avbrytas och renoveringen av idrottshallen ske i egen regi. Fastighetsnämnden driver sedan 2023 ett separat upprustningsprojekt för hallen.

Den del av projektet Herbariet som omfattar skola och nya idrottshallar har avstyckats till fastigheten Herbariet 4 och är upplåten med tomträtt till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB. Byggnationen startade i januari 2023 och skolan och idrottshallarna färdigställdes år 2024.

Exploateringsnämndens arbeten i allmän plats har delats in i tre etapper. Etappindelningen i projektet har tillsammans med markföreningar, högre VA-anslutningskostnader och generella byggkostnadsökningar lett till ökade utgifter jämfört med det gällande genomförandebeslutet.

De sammanlagda projektutgifterna i löpande prisnivå beräknas nu uppgå till cirka 77,1 mnkr, varav 62,2 mnkr är redan nedlagda utgifter. Av projektutgifterna utgörs 3,5 mnkr av utgifter som redovisas som driftkostnader. Projektinkomsterna beräknas uppgå till cirka 4,6 mnkr. Lönsamhetskalkylen redovisar ett nettonuvärde om 9 mnkr, inklusive tidigare nedlagda nettoutgifter. Täckningsgraden uppgår till 111 procent.

Exploateringsnämndens återstående arbeten i projektet består av en entreprenad med ett torg och beräknas vara klart våren 2027.

## Exploateringsnämnden


**Exploateringsnämnden** beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2026 följande.

Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till fortsatt genomförande av projekt Herbariet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner det fortsatta genomförandet och att exploateringsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en projektutgift om 71,1 miljoner kronor och en projektinkomst om 4,6 miljoner kronor.

**Exploateringskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2026 har i huvudsak följande lydelse.

### Bakgrund

Projekt Herbariet ligger invid Midsommarkransen gymnasium vid Essingeleden och Södertäljevägen, nära Tellusborgsvägen och Nybodadeplan, se bild 1.

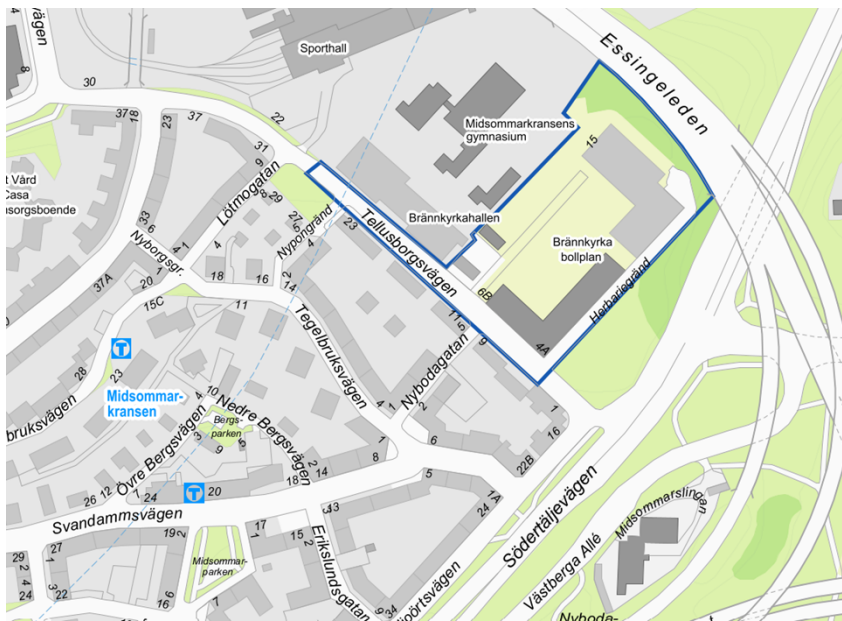

*Bild 1 med planområdet.*

I juni 2021 ingick exploateringsnämnden, idrottsnämnden, fastighetsnämnden och SISAB en avsiktsförklaring med Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB. Avsikten var att bolaget skulle ta i anspråk del av SISABs tomträtt Herbariet 2 för att uppföra en ny skola och en ny idrottshall. Avsikten var även att staden skulle hyra idrottslokalerna och Internationella Engelska Skolan skulle hyra skollokalerna samt att bolaget skulle förvärva och renovera Brännkyrkahallen.

Projektet har haft en pressad tidplan med målet att skolan skulle tas i bruk till höstterminens start 2024. Start-pm godkändes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021 och detaljplanen gick ut på samråd redan under hösten samma år. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022 och vann laga kraft i juli 2022. Den nya detaljplanen möjliggör två byggnader som inrymmer tre idrottshallar om cirka 8 100 m<sup>2</sup> BTA. Planen möjliggör även en grundskola om cirka 10 600 m<sup>2</sup> BTA, för årskurserna F–9 med cirka 1 000 elever.

Exploateringsnämnden beslutade om projektets genomförande i maj 2022 och i samma ärende godkändes överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse till bolaget. Enligt genomförandebeslutet ska staden stå för byggande av en ny lokalgata, nytt entrétorg samt upprustning av den befintliga Tellusborgsvägen.

För den delen av projektet som avsåg Brännkyrkahallen tog exploateringsnämnden och fastighetsnämnden beslut vid två tillfällen, i juni och i augusti 2022, om att hallen skulle värdeöverföras till exploateringskontoret och därefter säljas med tomträttsupplåtelse till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB.

Affärsupplägget var bland annat villkorat av att bolaget och staden tecknade hyresavtal för Brännkyrkahallen. Villkoren i avtalet uppfylldes inte och överlåtelse av hallen till bolaget genomfördes därmed ej. Sedan 2023 bedriver fastighetskontoret ett eget projekt för upprustning av hallen.

Den delen av detaljplanen som omfattar den nya skolan och de nya idrottshallarna har avstyckats till en separat fastighet, Herbariet 4, som är upplåten med tomträtt till bolaget. Byggnationen inom projektet startade i januari 2023. Skolan stod klar för inflyttning till skolstarten hösten 2024 och idrottshallarna invigdes i december 2024.

Stadens arbeten har delats upp i tre etapper: etapp 1 omfattar ledningsflytt och byggnation av en stödmur, etapp 2 huvudentreprenaden med den nya lokalgatan och åtgärder på Tellusborgsvägen, samt etapp 3 byggnation av entrétorget. Etapp 1 och 2 är slutförda och arbetena slutbesiktigades i december 2024. Etapp 3 beräknas slutföras under hösten 2027.

#### Tidigare beslut

| Datum      | Nämnd/kontor                                                                                           | Beskrivning                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-06-16 | SBN                                                                                                    | Start-PM                                                                                               |
| 2021-06-17 | Exploateringsnämnden, idrottsnämnden, fastighetsnämnden samt Skolfastigheter i Stockholm AB:s styrelse | Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB |
| 2021-11-25 | ExpIN                                                                                                  | Inriktningsbeslut                                                                                      |
| 2022-05-12 | ExpIN                                                                                                  | Genomförandebeslut                                                                                     |
| 2022-06-09 | ExpIN och fastighetsnämnden                                                                            | Beslut om tomträttsupplåtelse och försäljning av Brännkyrkahallen                                      |
| 2022-06-09 | SBN                                                                                                    | Antagande av detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft 2022-07-18                                       |

|            |                             |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-08-25 | ExpIN och fastighetsnämnden | Värdeöverföring av Brännkyrkahallen, byggnad inom fastigheten Herbariet 2, från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Ekonomiska konsekvenser för staden**

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

### Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar från och med beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt nettonuvärde om 9 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster motsvarande 49 tusen kronor/ekvivalent lägenhet. Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (bruttoarean) för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvadratmeter bruttoarea).

Marken har att upplåtits med tomträtt. Exploateringsgraden uppgår till 0,99.

De sammanlagda projektutgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 71,1 miljoner kronor, varav 62,2 miljoner kronor är utgifter före år 2026, det vill säga redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst en lokalgata, entrétorg och upprustning av Tellusborgsvägen, ledningsflytt och en VA-anslutning.

Av dessa utgör 3,5 miljoner kronor projektutgifter som redovisas som driftkostnader. Det avser främst stadens del för saneringskostnader.

Projektinkomsterna beräknas till cirka 4,6 miljoner kronor som utgörs av ersättning från trafikkontoret för del av gång- och cykelbana utmed Tellusborgsvägen, ersättningar från ledningsägare samt en uppskattad ersättning från fastighetskontoret för merkostnader för kommande entrétorg.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 368 tusen kronor i fast prisnivå. Detta är i jämförelse i linje med andra motsvarande projekt. (Nyckeltalet visar projektets nettoutgift/ekvivalent lägenhet inklusive redan nedlagda utgifter.) Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 111 procent.

All ekonomisk risk avseende byggaktörens del av projekteringen står bolaget för. Staden har risk för förgävesprojektering.

### Budgetkonsekvenser

## Projektbudget och försäljningsinkomster

Projektbudgeten för projektet beräknas till cirka 71,1 miljoner kronor och projektinkomsterna till cirka 4,6 miljoner kronor i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell:

| <b>Budgetkonsekvenser</b>        | <b>Ack</b>    |             |             |             |             |               |               |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Investering</b>               | <b>t.o.m.</b> |             |             |             |             |               |               |
| <b>Mnkr</b>                      | <b>2025</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Senare</b> | <b>Totalt</b> |
| Utgifter inkl. förvärv (-)       | -62,2         | -2,8        | -6,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0           | -71,1         |
| Inkomster (exkl. försäljning)    | 3,7           | 0,0         | 0,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 4,6           |
| <b>Nettoutgift (-) /-inkomst</b> | <b>-58,5</b>  | <b>-2,8</b> | <b>-5,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-66,5</b>  |
| Försäljningsinkomst              | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           |

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2026. Behov av medel för åren därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

## Driftbudget

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell.

| <b>Budgetkonsekvenser</b>     |             |             |             |             |             |               |               |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Drift</b>                  |             |             |             |             |             |               | <b>Kom-</b>   |
| <b>Mnkr</b>                   | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>Senare</b> | <b>mentar</b> |
| <b>Resultatpåverkan ExplN</b> |             |             |             |             |             |               |               |
| Löpande intäkter/kostnader    | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | max 2,8       |               |
| Ej aktiverbara utgifter       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0             | totalt -3,5   |
| Ej aktiverbara inkomster      | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0             | totalt 0      |
| Internränta                   | -0,3        | -1,7        | -1,7        | -1,7        | -1,6        | max -1,4      |               |
| Avskrivningar                 | -0,3        | -1,7        | -1,7        | -1,7        | -1,6        | max -1,4      | år 2027       |
| Reavinster/förluster          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | totalt 0      |
| Offentliga bidrag upplösning  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | totalt 0      |

|                                       |             |             |             |             |             |                      |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| Offentliga bidrag internränta         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  |          |
| <b>Summa resultatpåverkan nämnd</b>   | <b>2,3</b>  | <b>-0,7</b> | <b>-0,6</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> |                      |          |
| <b>Resultatpåverkan TRN+SDN</b>       |             |             |             |             |             |                      |          |
| Icke offentliga bidrag upplösning     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                  | totalt 0 |
| Driftskostnader TRN+SDN               | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        | mellan -0,2 och -0,3 |          |
| Underhållskostnader TRN               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | mellan 0 och -0,3    |          |
| <b>Summa resultatpåverkan TRN+SDN</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> |                      |          |

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 0,6 miljoner kronor.

Projektutgifter som redovisas som driftkostnader uppgår till 3,5 miljoner kronor.

Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 2,8 miljoner kronor det första året och minskar därefter något genom avskrivningar.

Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till cirka 2,8 miljoner kronor per år.

#### Förändringar jämfört med tidigare beslut

De totala utgifterna i projektet enligt detta utlåtande beräknas uppgå till totalt 71,1 miljoner kronor. I genomförandebeslutet maj 2022 var dessa prognosticerade till totalt 49 miljoner kronor. Den kalkyl som låg till grund för genomförandebeslutet beaktade inte den etappindelning som under projektets genomförande bedömdes nödvändig för att hålla den pressade tidplanen för skolans inflyttning samt för att möjliggöra ett rationellt genomförande. Etappindelningen har medfört omtag i tidigare projekteringar och ökat antalet entreprenadupphandlingar, vilket har varit kostnadsdrivande.

Etapp 3, som avser entrétorget, ingick ursprungligen i etapp 2. Under hösten 2023 framförde fastighetskontoret önskemål om att använda ytan för byggetablering i samband med renoveringen av Brännkyrkahallen. Staden avbeställde därför arbetet med entrétorget och avser att genomföra ombyggnationen när fastighetskontorets



behov har upphört, preliminärt våren 2027. Eventuella merkostnader till följd av senareläggningen ska ersättas av fastighetskontoret.

Tidigt i projektet, under projekteringsskedet, genomfördes markmiljöundersökningar inom projektområdet utan att några förhöjda halter påvisades. I samband med schaktarbeten för skolan påträffades dock föroreningar, vilket medförde ökade kostnader för staden om cirka 2,9 miljoner kronor.

Projektet har även påverkats av de generella kostnadsökningar som skett under de senaste åren. Den kalkyl som låg till grund för genomförandebeslutet togs fram våren 2022, och sedan dess har kostnadsläget ökat betydligt, vilket har påverkat projektekonomin negativt. Därutöver har kostnaden för VA-anslutning blivit högre än vad som prognosticerades vid genomförandebeslutet.

I tidigare genomförandebeslut antogs att tomträttsavgälden skulle baseras på avgäldsnivåerna för Midsommarkransen. Eftersom exploateringsområdet är beläget inom Liljeholmens stadsdel har avgälden i tomträttsavtalen i stället baserats på nivåerna för Liljeholmen. Avgälden fastställdes därmed till 155 kr/kvm, jämfört med tidigare antagna 134 kr/kvm, vilket har medfört högre tomträttsavgälder än beräknat.

Sammantaget har sedan det tidigare genomförandebeslutet både utgifterna och inkomsterna i projektet ökat. I nedanstående tabell redovisas skillnader mellan senaste beslut och aktuellt utlåtande.

|                                | <b>Genomförandebeslut<br/>maj 2022</b> | <b>Reviderat<br/>genomförandebeslut<br/>april 2026</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Projektutgifter, brutto</b> | 49                                     | 71,1                                                   |
| <b>Projektutgifter, netto</b>  | 45,3 mnkr                              | 66,5 mnkr                                              |
| <b>Projektinkomster*</b>       | 3,7 mnkr                               | 4,6 mnkr                                               |
| <b>Tomträttsavgäld/år</b>      | 2,2 mnkr                               | 2,8 mnkr                                               |
| <b>Nettonuvärde*</b>           | 14 mnkr                                | 9 mnkr                                                 |
| <b>Täckningsgrad*</b>          | 121 %                                  | 111 %                                                  |

\*exklusive löpande avgäldsintäkter

\*\*Inklusive tidigare nedlagda kostnader

*Tabell 1. Jämförelse mellan tidigare genomförandebeslut och aktuellt utlåtande.*

#### Ekonomiska osäkerheter

Projektet befinner sig i ett slutskede, med en återstående entreprenad som omfattar upprustning av entrétorget. Åtgärden är färdigprojekterad och av begränsad omfattning, varför några större ekonomiska osäkerheter eller risker inte bedöms föreligga.

### Slutsats ekonomi

Projektets utgifter har ökat jämfört med genomförandebeslutet från maj 2022, främst till följd av etappindelning av entreprenader, markföreningar, högre VA-anslutningskostnader samt generellt ökade byggekostnader. Sannolikheten för ytterligare större kostnadsökningar bedöms som liten.

### **Genomförandefrågor**

#### Tidplan

Projektet befinner sig i ett sent skede. Den sista etappen av staden arbeten beräknas påbörjas under våren 2027 och vara slutförd hösten 2027.

#### Risker och osäkerheter

I tidigare beslut bedömdes det finnas risk för att tidplanen inte skulle kunna hållas, vilket skulle ha påverkat Internationella Engelska Skolans verksamhet och skolstarten hösten 2024. Projektet lyckades dock hålla tidplanen, och skolan kunde flytta in i tid.

Projektet är i övrigt genomfört, och de återstående arbetena med entreprenaden för det blivande torget bedöms inte medföra några större risker eller osäkerheter.

### **Kommunikation**

Kontoret diskuterar projektet löpande med stadsdelsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 miljoner kronor har avstämning skett med stadsledningskontoret.

### **Kontorets sammanfattande bedömning**

Kontoret anser att projektet bidrar till en bra utveckling av platsen med idrottshallar, en grundskola, torg och lokalgata.

Projektet är i huvudsak genomfört och en mindre upprustning av entrétorget är planerat att slutföras under 2027. Därefter kommer projektet att slutredovisas.

### **Remissammanställning**

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

### **Stadsledningskontoret**

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 25 juni 2026 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Herbariet som utveckling av stadsdelen Liljeholmen med idrottshallar, grundskola, torg och lokalgata.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet fördyrats väsentligt jämfört med gällande genomförandebeslut. Nettoutgifterna har ökat med 21,2 mnkr, motsvarande 47 procent. Enligt stadens regelverk krävs ett reviderat genomförandebeslut.

Stadsledningskontoret konstaterar att stora delar av projektet redan är genomförda. De totala projektutgifterna beräknas till 77,1 mnkr och de redan nedlagda utgifterna uppgår till 62,2 mnkr, motsvarande 87 procent.

Exploateringsnämnden redogör för att etappindelningen i projektet, markföreningar, VA-anslutningskostnader och generella byggkostnadsökningar varit kostnadsdrivande och lett till ökade utgifter jämfört med det tidigare genomförandebeslutet. Stadsledningskontoret förutsätter att inga ytterligare fördyringar sker.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att exploateringsnämnden medges rätt att genomföra projektet Herbariet, till en projektutgift om 71,1 och en projektinkomst om 4,6 mnkr. Utgifterna för år 2026 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för år 2027.
