8002170 Bergbana Skärholmen
Huvudtidplan 2.3

Daterad: 2021-02-02
Rev 2.3: 2021-08-24

ID	Aktivitetsti	Aktivitet	Varaktig	Start	Slut
1		**Övergripande**	**414 da**	**må 20-08-03**	**fr 22-03-04**
2		**Projektering**	**414 da**	**må 20-08-03**	**fr 22-03-04**
3		**Program/systemhandling**	**172 da**	**må 20-08-03**	**on 21-03-31**
4		**Program- och systemhandlingsprojektering**	**172 da**	**må 20-08-03**	**on 21-03-31**
9		**Förfrågningsunderlag**	**241 da**	**to 21-04-01**	**fr 22-03-04**
10		**Detaljprojektering**	**156 da**	**to 21-04-01**	**fr 21-11-05**
11		Detaljprojektering	126 da	to 21-04-01	to 21-09-23
12		Leverans koder/kravtexter till TB	0 daga	fr 21-06-18	fr 21-06-18
13		Leverans granskningshandling	0 daga	fr 21-09-24	fr 21-09-24
14		Granskning	20 dag	må 21-09-27	fr 21-10-22
15		Justering av granskningssynpunkter	9 daga	må 21-10-25	to 21-11-04
16		Leverans FU	0 daga	fr 21-11-05	fr 21-11-05
17		**Kalkyl**	**20 dag**	**må 21-09-27**	**fr 21-10-22**
18		Kostnadskalkyl FU	20 dag	må 21-09-27	fr 21-10-22
19		Osäkerhetsanalys	5 daga	må 21-10-18	fr 21-10-22
20		**Bygghandling**	**0 daga**	**fr 22-03-04**	**fr 22-03-04**
21		Leverans BH	0 daga	fr 22-03-04	fr 22-03-04
22		**Bygglov/ genomförandeavtal**	**101 da**	**fr 21-10-01**	**fr 22-02-18**
23		Leverans bygglovshandlingar	0 daga	fr 21-10-01	fr 21-10-01
24		Bygglovsprocess	100 da	må 21-10-04	fr 22-02-18
25		Genomförandeavtal/servitusavtal TK - Stockholmshem	65 dag	må 21-10-04	fr 21-12-31
26		**Entreprenadupphandling**	**85 dag**	**må 21-11-08**	**fr 22-03-04**
27		Fastställt FU + beslut om upphandling	0 daga	må 21-11-08	må 21-11-08
28		Anbudsräkning/tildelning/kontrakt	80 dag	må 21-11-15	fr 22-03-04
29		**Entreprenad**	**334 da**	**må 22-03-07**	**to 23-06-15**
30		Planering/förberedelse	30 dag	må 22-03-07	fr 22-04-15
31		Fysiska entreprenadarbeten	304 da	må 22-04-18	to 23-06-15
32		**Kommunikation- och information**	**417 da**	**on 21-11-10**	**to 23-06-15**
33		**Allmän info**	**414 da**	**må 21-11-15**	**to 23-06-15**
34		Fråga/svarlista	0 daga	må 21-11-15	må 21-11-15
35		PP presentation för allmäninfo om projektet	0 daga	må 21-11-15	må 21-11-15
36		Hemsida_Sthlm Stad (Sthlm växer) + intranät	0 daga	må 21-11-15	må 21-11-15
37		Intranät	0 daga	må 21-11-15	må 21-11-15
38		Linkedin (Sthlm stad + konsulter). Uppdatering var 3/6:e månad med framdrift?	414 dagar	må 21-11-15	to 23-06-15
39		Hemsidor (konsulter).	0 daga	må 21-11-15	må 21-11-15
40		**Intern information**	**82 dag**	**on 21-11-10**	**fr 22-03-04**
41		Gestaltningsgruppen/SBK - info	0 daga	on 21-11-10	on 21-11-10
42		Internpresentationsunderlag enhet/avdelning	0 daga	fr 22-03-04	fr 22-03-04
43		**Extern information**	**108 da**	**on 21-11-10**	**må 22-04-11**
44		SDF/Fokus Skärholmen	0 daga	on 21-11-10	on 21-11-10
45		Möte med närliggande boende/Sthlm Hem innan byggstart	0 dagar	må 22-04-11	må 22-04-11
46		**Pressinformation**	**308 da**	**må 22-04-11**	**to 23-06-15**
47		Lokalmedia/press innan byggstart	0 daga	må 22-04-11	må 22-04-11
48		Fackmedia/press (K,A,LA) innan byggstart	0 daga	må 22-04-11	må 22-04-11
49		Lokalmedia/press halvtid (platsbesök)	0 daga	ti 22-11-01	ti 22-11-01
50		Fackmedia/press (K,A,LA) halvtid (platsbesök)	0 daga	ti 22-11-01	ti 22-11-01
51		Lokalmedia/press inför och på invigning/driftstart	0 daga	to 23-06-15	to 23-06-15
52		Fackmedia/press (K,A,LA) inför och på invigning/driftstart	0 daga	to 23-06-15	to 23-06-15
53		**Platsinformation**	**315 da**	**fr 22-04-01**	**to 23-06-15**
54		Platsinformation - informationstavlor om projektet + vepor (30cm bredd) runt arbetsområdets plank/nätstängsel	0 dagar	må 22-04-18	må 22-04-18
55		Platsinformation - hänvisningsskyltning (alt vägar/ersättningstrafik)	0 dagar	må 22-04-18	må 22-04-18
56		Infotavla/monter med modell i Sklm Sdf/medborgarhus entré	0 dagar	fr 22-04-01	fr 22-04-01
57		Info närliggande trappuppgångar. Brev + anslag alt Sthlm hems hemsida? Uppdatering i trappuppgångar varannan vecka.	315 dagar	fr 22-04-01	to 23-06-15
58		**Invigning**	**33 dag**	**må 23-05-01**	**to 23-06-15**
59		Utlottning biljetter till första turen	33 dag	må 23-05-01	on 23-06-14
60		Invigningsarrangemang med bergbanetema (alpin/bergsbestigare el liks)	0 dagar	to 23-06-15	to 23-06-15

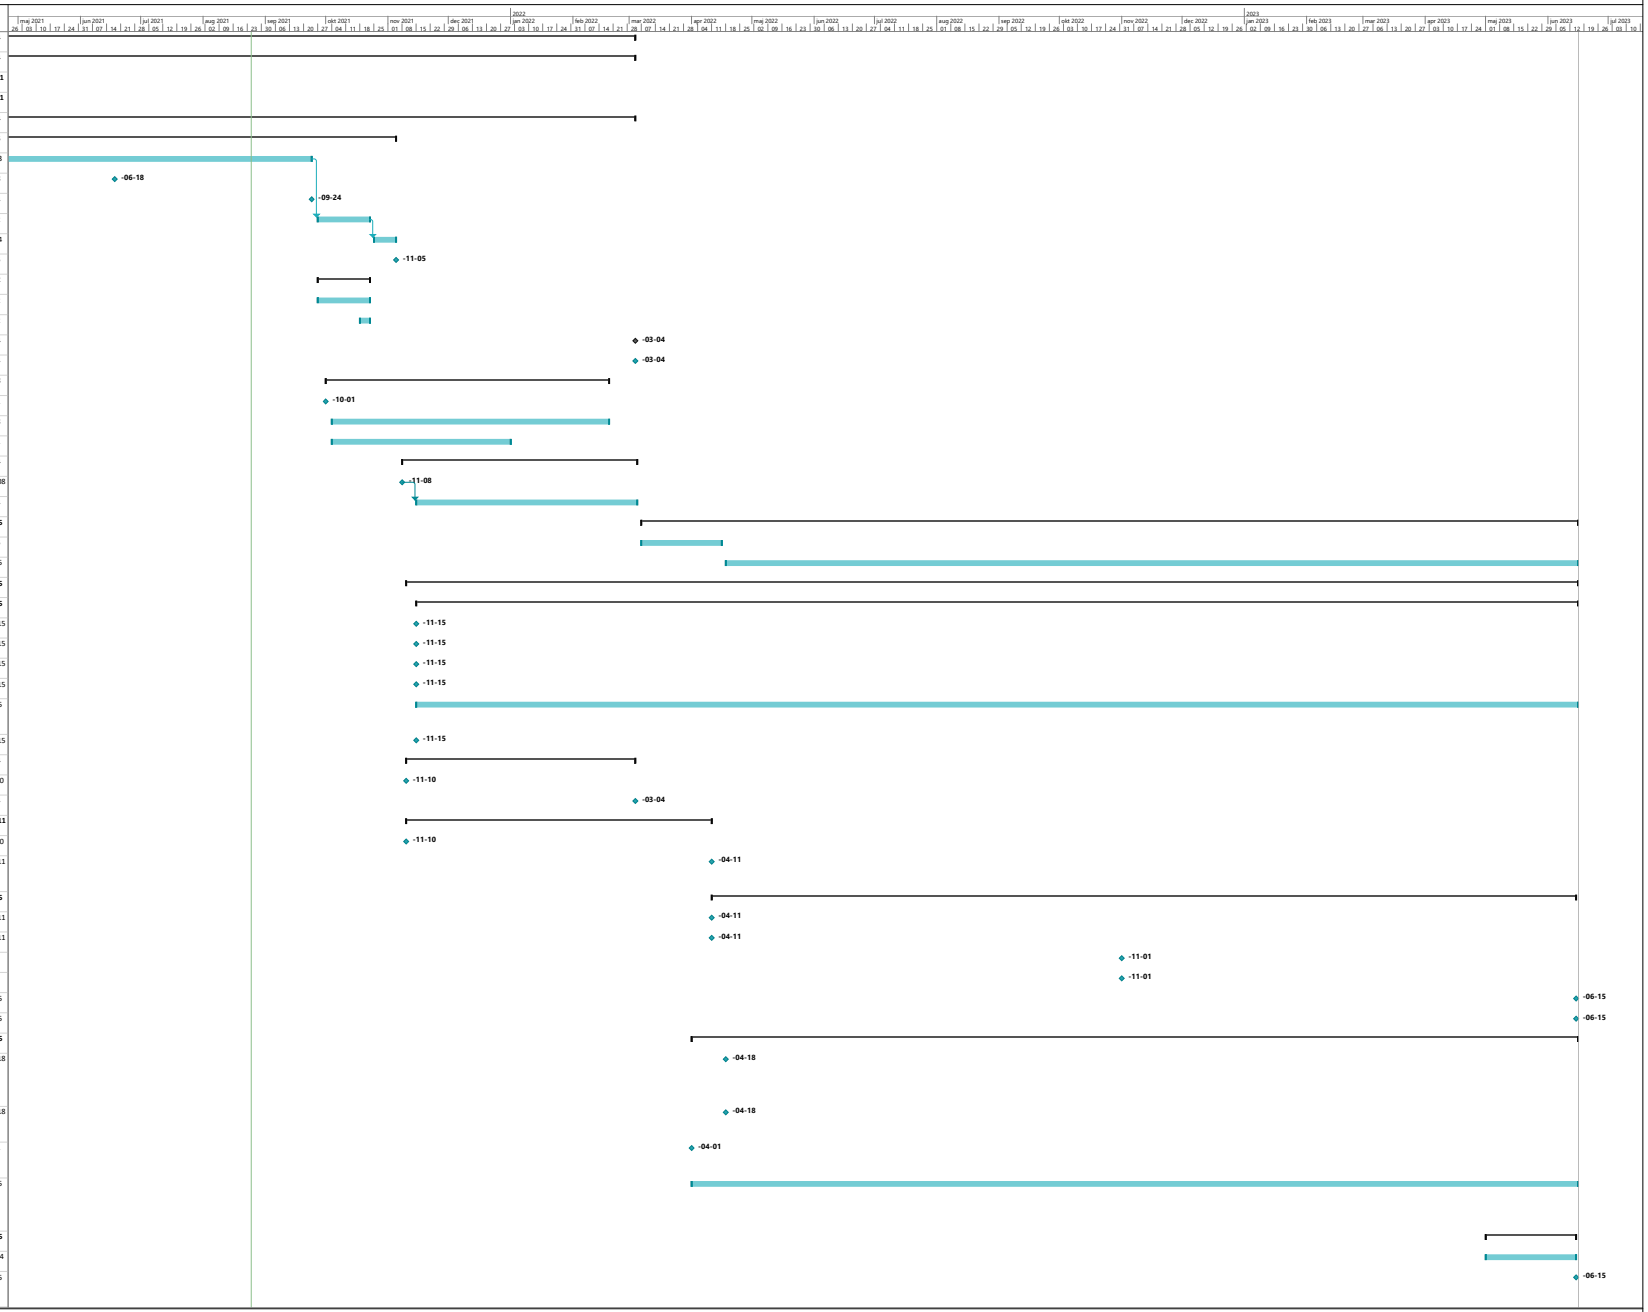

Projekt: 8003902 Projekttidplan
Datum: on 21-08-25

Aktivitet | Delad | Milstolpe | Sammanfattning | Projektsammanfattning | Inaktiv aktivitet | Inaktiv milstolpe | Inaktiv sammanfattning | Manuell aktivitet | Endast varaktighet | Upplyft manuell sammanfattning | Manuell sammanfattning | Endast start | Endast slutdatum | Externa aktiviteter | Externa milstolpe | Måldatum | Förlopp | Manuellt förlopp
